

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）		提交单位	
--------	--	------	--

第一部分 土壤分类

1、亚类不存在（1个）：潮滩滨海盐土 土属不存在（2个）：典型沼泽土、氯化物潮滩滨海盐土 土种不存在（8个）：

- 壤夹砂重度氯化物盐化潮土
- 砂壤体黏重度氯化物盐化潮土
- 黏体砂重度氯化盐化潮土
- 黏壤体砂中度氯化物盐化潮土
- 黏壤夹砂轻度氯化物盐化潮土
- 黏壤夹砂重度氯化物盐化潮土
- 黏壤轻度沼泽土
- 黏质氯化物潮滩滨海盐土

成组不存在（3组）：
滨海盐土 | 潮滩滨海盐土 | 氯化物潮滩滨海盐土 | 黏质氯化物潮滩滨海盐土
沼泽土 | 典型沼泽土 | 典型沼泽土 | 均黏壤沼泽土
沼泽土 | 典型沼泽土 | 典型沼泽土 | 均黏质沼泽土

2、问题描述

截图
.....

第二部分 制图过程

1、野外验证路线没有穿过点位

(2) 从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取 10 个图斑，3 条路线一共选出 30 个图斑（图 4.26）。

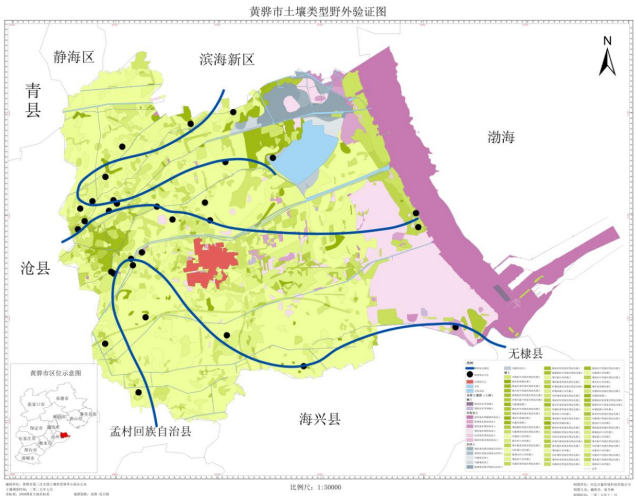


图4.26 黄骅市精度验证点位及路线图


2、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第三部分 制图结果


1、
截图

第四部分 图面表达


1、断面图，线条未进行概化、图与表比例不均衡、未标注关键地名、图字体太小。

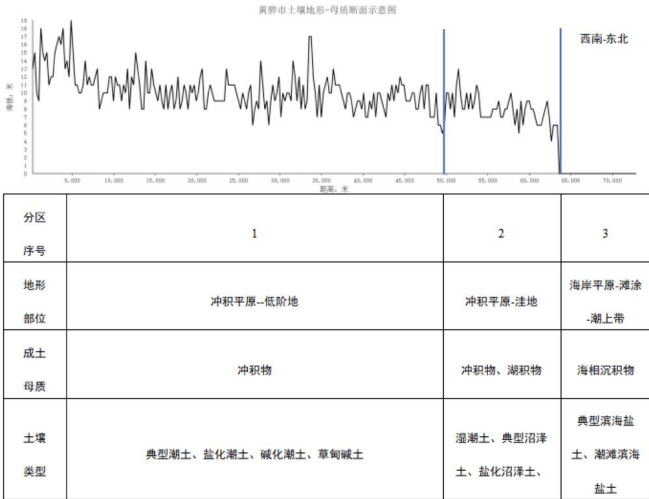

请参照海兴县

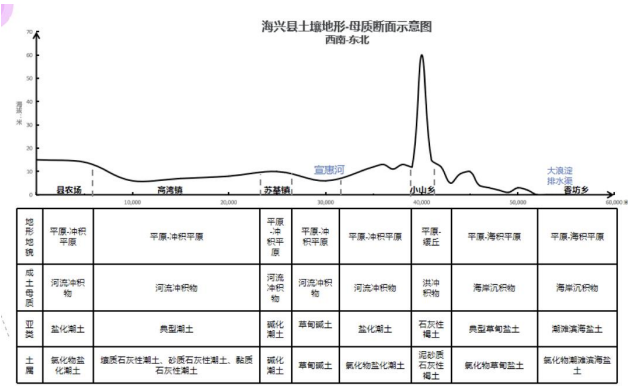

2、请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T 1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制

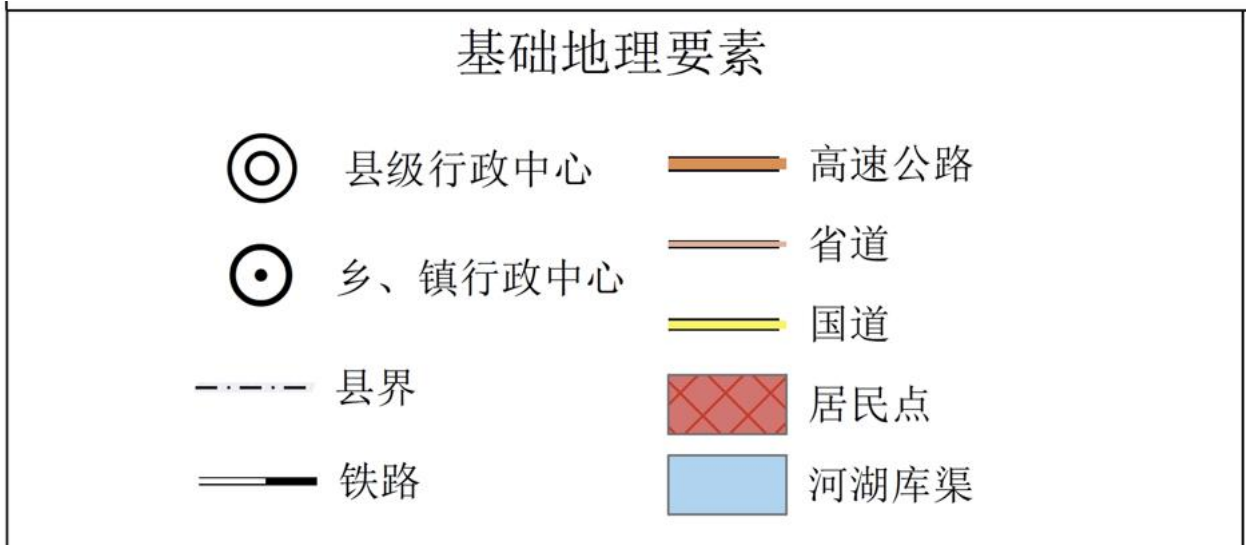


3、色标按照《土壤制图 1: 25000 1: 50000 1: 100000 中国土壤图用色和图例规范》

土壤类型		土壤类型	
潮土		26 砂壤底黏中度氯化物盐化潮土	53 黏夹砂中度氯化物盐化潮土
1 均砂壤石灰性潮土	27 均壤质轻度氯化物盐化潮土	54 黏夹砂重度氯化物盐化潮土	
2 砂壤体黏石灰性潮土	28 均壤质中度氯化物盐化潮土	55 黏体砂轻度氯化物盐化潮土	
3 砂壤底黏石灰性潮土	29 均壤质重度氯化物盐化潮土	56 黏体砂中度氯化物盐化潮土	
4 均壤质石灰性潮土	30 壤夹黏轻度氯化物盐化潮土	57 黏体砂重度氯化物盐化潮土	
5 壤夹黏石灰性潮土	31 壤夹黏中度氯化物盐化潮土	58 黏底砂轻度氯化物盐化潮土	
6 壤体砂石灰性潮土	32 壤体砂中度氯化物盐化潮土	59 黏底砂中度氯化物盐化潮土	
7 壤体黏石灰性潮土	33 壤体砂重度氯化物盐化潮土	60 壤底砂重度氯化物盐化潮土	
8 壤底砂石灰性潮土	34 壤体黏轻度氯化物盐化潮土	61 壤质轻度碱化潮土	
9 壤底黏石灰性潮土	35 壤体黏中度氯化物盐化潮土	62 壤质中度碱化潮土	
10 均黏壤石灰性潮土	36 壤体黏重度氯化物盐化潮土	63 壤质重度碱化潮土	
11 黏壤夹砂石灰性潮土	37 壤底砂轻度氯化物盐化潮土	64 黏质轻度碱化潮土	
12 黏壤底砂石灰性潮土	38 壤底砂中度氯化物盐化潮土	沼泽土	
13 均黏质石灰性潮土	39 壤底砂重度氯化物盐化潮土	65 均黏壤沼泽土	
14 黏夹砂石灰性潮土	40 壤底黏轻度氯化物盐化潮土	66 均黏质沼泽土	
15 黏体砂石灰性潮土	41 壤底黏中度氯化物盐化潮土	67 壤质轻度氯化物盐化沼泽土	
16 黏底砂石灰性潮土	42 壤底黏重度氯化物盐化潮土	68 壤质重度氯化物盐化沼泽土	
17 均壤质湿潮土	43 均黏壤轻度氯化物盐化潮土	69 壤质重度氯化物盐化沼泽土	
18 均黏壤湿潮土	44 均黏壤中度氯化物盐化潮土	滨海盐土	
19 均砂质重度氯化物盐化潮土	45 均黏壤重度氯化物盐化潮土	70 砂质氯化物滨海盐土	
20 均砂壤轻度氯化物盐化潮土	46 黏壤夹砂中度氯化物盐化潮土	71 壤质氯化物滨海盐土	
21 均砂壤中度氯化物盐化潮土	47 黏壤底砂轻度氯化物盐化潮土	72 黏壤氯化物滨海盐土	
22 均砂壤重度氯化物盐化潮土	48 黏壤底砂中度氯化物盐化潮土	73 黏质氯化物滨海盐土	
23 砂壤夹黏中度氯化物盐化潮土	49 黏壤底砂重度氯化物盐化潮土	74 黏质氯化物滩涂滨海盐土	
24 砂壤夹黏重度氯化物盐化潮土	50 均黏质轻度氯化物盐化潮土	碱土	
25 砂壤底黏轻度氯化物盐化潮土	51 均黏质中度氯化物盐化潮土	75 壤质浅位草甸碱土	
	52 均黏质重度氯化物盐化潮土	76 黏质浅位草甸碱土	

4、无地形信息（等高线）

5、信息被遮挡



第五部分 报告质量

- 1、字体、字号、加粗、间距、标题等格式问题，请通篇检查并修正
- 2、报告中的所有图，比例尺应该增加线段比例尺，不能只有文字比例尺
- 3、缺少虚点对土壤类型代表性的证明示例
- 4、图名完全一致

[P138]图 4.21 第二轮推测制图亚类环境变量重要性图 66

[P149]图 4.22 第二轮推测制图亚类环境变量重要性图 67

5、工作报告存在以下严重低级问题

"高碑店市"替代了"黄骅市":

原文证据（工作报告 P228）：高碑店市野外校核工作组由河北百淼环境科技有限公司和河北农业大学师生共同完成。

原因：明显为模板复制错误，"高碑店市"是河北省保定市下辖县级市，与黄骅市无关。

"顺平"替代了"黄骅市":

原文证据（工作报告 P130）：协助公司识别顺平特色土壤

原文证据（工作报告 P131）：组建顺平项目组

原因：明显为模板复制错误，"顺平"是河北省保定市下辖县，与黄骅市无关。

"半山区"描述错误:

原文证据（工作报告 P247）：根据黄骅市半山区的实际情况

原因：黄骅市为沿海平原城市，不存在山区地形，"半山区"描述与实际地理情况严重不符，应为模板复制错误。

"褐土"引用错误:

原文证据（工作报告 P75）：黄骅市各种土壤类型划分为 3 个土类（褐土、沼泽土、盐土）

原文证据（工作报告 P135）：如潮土需记录锈纹锈斑分布层位，褐土需标注黏化层厚度

原文证据（工作报告 P140）：如褐土黏化层厚度是否达标、潮土氧化还原特征是否明确

原因：黄骅市二普土壤分类应为“潮土、沼泽土、盐土”3个土类，“褐土”是山区土壤类型，不属于黄骅市。P135和P140中引用褐土判定标准同样为模板复制错误。

6、技术报告上下文不一致

存在前后文不一致的情况：

表 4.19 总面积远超全市总面积，数据异常：

表 4.19“黄骅市土壤类型分布表”（行 3300，P3754）“总计”面积为 9013025 亩。

表 5.1“三普土壤类型数量面积统计”（行 3790，P4469）“总计”面积为 3455581 亩。

黄骅市全市总面积为 2212 平方千米（行 146/P158），约合 3318000 亩。

表 5.1 的 3455581 亩与全市总面积 3318000 亩基本吻合（差异为微小的统计边界和未覆盖区域），数据合理。

表 4.19 的 9013025 亩远超全市总面积（约为全市面积的 2.7 倍），数据明显错误。表 4.19 为按亚类-乡镇统计的面积分布表，推测可能是部分亚类面积被重复统计（同一地块出现在多个亚类下），或数据导入错误，但报告中未做任何说明。

原文证据（表 4.19）：9013025（总计）

原文证据（表 5.1）：表 5.1 黄骅市三普土壤类型数量面积统计 3455581（总计）

原文证据（全市总面积）：

全市总面积为 2212 平方千米

7、技术报告与工作报告不一致

二普土种数量说法不一致：

工作报告（P75）：15 个土属和 76 个土种

技术报告（P3761）：二普土壤类型包括 3 个土类，7 个亚类，15 个土属，79 个土种

技术报告（P3760）：由二普的 79 个变化为三普的 76 个（经搜索，确认为行 3448/P3761 的上下文）

工作报告在二普部分写“76 个土种”有误，应为 79 个。

原因：工作报告中将二普土种数量错写为 76 个（实际为 79 个），混淆了二普和三普的土种数量。

8、请通篇检查完全重复的表格，判断是否有必要保留

9、各报告全文存在多处数据、表述不一致问题，属于严重低级错误，后续国家级验收当中容易出现一票否决情况，请通篇检查并修正

10、字体、字号、加粗、间距、标题等格式问题，请通篇检查并修正

第六部分 其他

1、问题描述

第七部分 质控意见

质控意见	通过 / 整改后通过 / 不通过	质控日期	2026 年 6 月 xx 日
复核日期		质控人签字	
整改复核结论	通过 / 继续整改 / 不通过	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院
