

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	132336 隆尧县	提交单位	河北普华环境技术服务有限公司
--------	------------	------	----------------

第一部 土壤分类

1、属性字段检查

1. "面积"字段现在的命名不是标准名称，标准命名规范是"MJ"，别名包括："面积"
2. "土类"字段现在的命名不是标准名称，标准命名规范是"TL"，别名包括："土类"
3. "亚类"字段现在的命名不是标准名称，标准命名规范是"YL"，别名包括："亚类"
4. "土属"字段现在的命名不是标准名称，标准命名规范是"TS"，别名包括："土属"
5. "土种"字段现在的命名不是标准名称，标准命名规范是"TZ"，别名包括："土种"

2、土属、土种不存在于分类单当中，且存在剖面与成果图不一致的问题，表层样也请检查！

✔ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 44 个问题

2. 图斑 1：省级分类清单无该土属

3. 图斑 2：省级分类清单无该土属


4. 图斑 5：省级分类清单无该土属

5. 图斑 6：省级分类清单无该土属

6. 图斑 9：省级分类清单无该土属

7. 图斑 10：省级分类清单无该土属

3、校核路线图没有图例，指北针等规范，

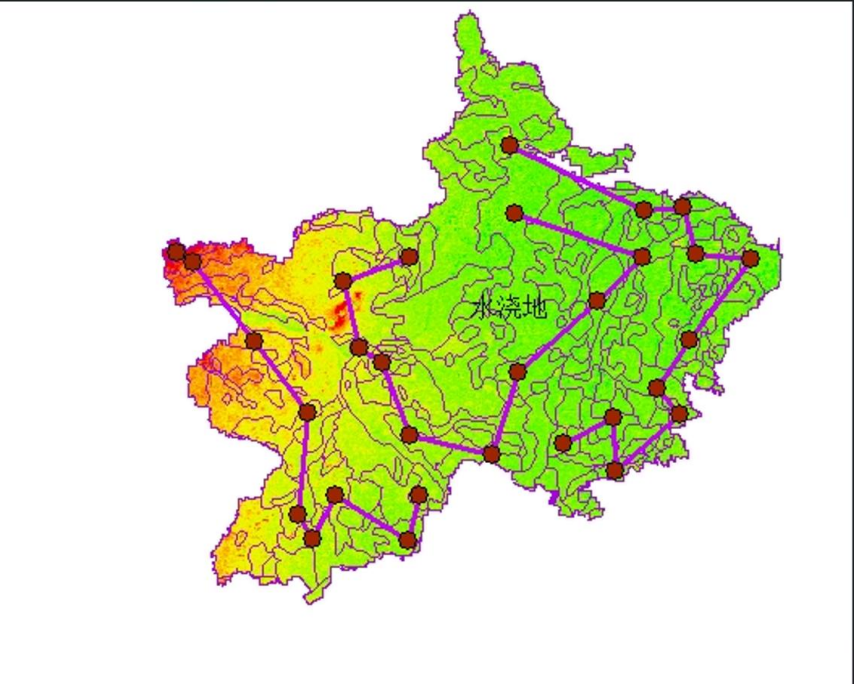

第二部分 制图过程

1、坐标不符合规范

序号	文件路径	不符合原因
1	三、过程数据\3. 土壤推测制图 tiff 数据\推测的三普土壤图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	三、过程数据\3. 土壤推测制图 tiff 数据\隆尧县不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)

第三部分 制图结果

1、建成区应以完整面状图斑表示；



第五部分 报告质量

1、工作报告中目录不正确；缺少表目录和图目录

目录

（一）土壤类型与制图工作背景	1
（二）土壤类型与制图的目的意义	2
1. 目的	2
2. 土壤“三普”意义	2
二、工作组织情况	3

2、（五）推测制图”在目录中缺失（目录直接从“（四）野外校核”跳到“（六）土壤图验证”）

- 三、任务实施与完成情况
- （一）数据收集情况

（二）室内校核

（三）改变区提取

（四）野外校核

（六）土壤图验证

3、工作报告中“顺平”占位符未替换成隆尧县

题整改。在公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建顺平项目组，全部人员经培训后持证上岗；设立现场质控小组，负责外业踏勘全程质控。隆尧县层面指派 1-2 名熟悉本地土壤的农

技骨干，协助公司识别顺平特色土壤、确认土地利用现状等。

4、工作报告“三普剖面样点”数量与技术报告不一致

三普在隆尧县共采集了剖面土壤整段样本 100 件。

土壤三普在隆尧县共采集了剖面土壤整段样本 26 件。

5、目录新编土壤类型图验证与分析缺失，且土壤类型空间推测不全

第四章土壤类型图编制

4.1技术路线

4.1.1技术依据

4.1.2技术路线

4.1.3组织实施

4.2数据的收集与制备

4.2.1土壤数据及处理

4.2.2环境因素数据及处理

4.3土壤二普土壤图室内校核

4.3.1图斑边界的校核

4.3.2图斑土壤类型的校核

4.4土壤类型改变区提取与专家预判

4.4.1引起土壤类型改变的主要情形

4.4.2筛选土壤类型改变区地块提取

4.4.3专家预判提取地块的土壤类型

4.5土壤二普土壤图野外校核

4.5.1校核方案的设计与实施过程

4.5.2校核结果的归纳和整理

4.6土壤类型空间推测

4.6.1训练样本准备

第五章 小结

6、技术报告中表名字体应为五号黑体，仔细检查全文。

11/11 1.0.0

表 7 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
褐土	石灰性褐土	褐土	石灰性褐土
	褐土性土		褐土性土
	褐土		典型褐土
	潮褐土		潮褐土
潮土	潮土	潮土	典型潮土
	盐质潮土		
盐土	内陆草甸盐土		
风沙土	风沙土	风沙土	草甸风沙土

7、 报告中的颜色统一成黑色

4.3.2.2 修正二普土种命名

依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》、《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修正了 27 个土种名称，部分修正后图斑仍需要通过外业补充土层厚度、通过三普表层样、剖面样点数据砾石含量、表层质地和腐殖质层厚度。

（1）对补充完善的二普矢量土壤图名称缺少信息的进行标记。

①针对缺少表层质地、砾石含量和腐殖质层，结合表层样数据进行补充完善，其中缺少砾石含量和表层质地的图斑有 92 个，缺少腐殖质层厚度的图斑有 8 个。室内修订 92 个图斑的表层质地和砾石含量，9 个缺少腐殖质层的图斑，并选取了 7 个典型点位进行野外验证。

②缺少土层厚度的图斑有 53 个，结合三普剖面补充命名的有 2 个，剩余 51 个，选取 5 个具有代表性的外业校核。

③与表层质地不一致的图斑有 27 个，二普为轻壤质或砂壤质，三普表层样点位黏壤质。选取 8 个具有代表性的外业校核。（点 1-12、19、25、26、29、30、31、39、50、51）。

8、 技术报告全文表、图编号严重混乱（表、图号跳号、重复、缺失）

9、 大量表格无表头或表头不完整

使土壤颗粒之间的结合更加松散和均匀。



10、照抄技术规范内容，缺少落地做法

•4.3 土壤二普土壤图室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普隆尧县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的高分影像（空间分辨率≤4m）、国土三调土地利用现状图、数字高程模型（DEM 空间分辨率≤10m）、母质图上由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

43

经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界无显著偏差或错位，同时，标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

第六部分 其他

1、报告应有 doc 和 pdf 两种形式

 隆尧县第三次全国土壤普查土壤类型制图...	2026/3/5 16:36	Microsoft Word ...	30,271 KB
 隆尧县第三次全国土壤普查土壤类型制图...	2026/3/5 16:40	Microsoft Word ...	40,567 KB

2、缺少自查表扫描件

 二、基础数据	2026/5/29 20:48	文件夹
 六、汇报PPT	2026/5/29 20:49	文件夹
 三、过程数据	2026/5/29 20:46	文件夹
 四、成果数据	2026/5/29 20:49	文件夹
 五、图层Layout包	2026/5/29 20:49	文件夹
 一、第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/5/29 20:49	文件夹

第七部分 质控意见

1、地图文档未保存为相对路径



质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------
