

# 河北省土壤类型图成果质控意见模板

|        |           |      |            |
|--------|-----------|------|------------|
| 县（市、区） | 130929 献县 | 提交单位 | 河北诚秀科技有限公司 |
|--------|-----------|------|------------|

## 第一部分 土壤分类

### 1、未采用最新的 5 级分类

（3）土种。

献县二普命名分为 6 级，即沙土、砂壤质、轻壤质、中壤质、重壤质和粘土。  
三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；  
二普的沙土依然对应砂土；砂壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

### 2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该亚类/土属/土种，请全部核查

|                           |
|---------------------------|
| 检查完成                      |
| 1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 23 个问题 |
| 2. 剖面 1：省级分类清单无该土属        |
| 3. 剖面 2：省级分类清单无该土属        |
| 4. 剖面 3：省级分类清单无该亚类        |
| 5. 剖面 4：省级分类清单无该土属        |
| 6. 剖面 5：省级分类清单无该土属        |
| 7. 剖面 6：省级分类清单无该土属        |
| 剖面类型与剖面类型检查               |

3、核查三普土壤剖面样点和土壤三谱土壤类型成果图，剖面与图斑不一致

|                           |
|---------------------------|
| 恒巨元成                      |
| 1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 24 个问题 |
| 2. 剖面 1 vs 图斑 184：土属不一致   |
| 3. 剖面 2 vs 图斑 67：土属不一致    |
| 4. 剖面 3 vs 图斑 12：土类不一致    |
| 5. 剖面 4 vs 图斑 276：土属不一致   |
| 6. 剖面 5 vs 图斑 218：亚类不一致   |
| 7. 剖面 6 vs 图斑 230：亚类不一致   |
| 土壤剖面面积统计                  |

4、核查三普土壤表层样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

与分类清单检查：共发现 701 个问题

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土种

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土属

省级分类清单无该土属

5、核查三普土壤表层样点和土壤三谱土壤类型成果图，剖面与图斑不一致

vs 图斑 74: 亚类不一致

vs 图斑 376: 土属不一致

vs 图斑 376: 亚类不一致

vs 图斑 261: 亚类不一致

vs 图斑 140: 亚类不一致

vs 图斑 376: 土属不一致

第二部分 制图过程

1、阐述了虚点的具体选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

种之间的边界，从而提高土壤类型推测制图的精度，为土壤资源的科学管理和合理利用提供有力支持。

本次样点准备工作，采用三普剖面点位、三普野外校核点位以及通过上述方法一、二共同确定的土壤类型典型虚点。献县推测制图点位共布设 1655 个，其中，三普剖面样点 24 个、二普图野外校核点位 115 个，拾取土壤类型典型虚点 1516 个。

表·30 每个土种内样点数量一览表

2、表格与文字描述对应不一致

图·19 二普与三普对应命名存疑校核结果

表·24 二普与三普对应命名存疑校核结果一览表

| 编号  | 二普土种   | 三普土种     |
|-----|--------|----------|
| 4-3 | 粘质漏沙潮土 | 壤体砂石灰性潮土 |

4-3-4 二普土种名称与成土环境的符

一键美

4.5.2.3 二普与三普命名对应存疑校核结果。

校核二普与三普命名对应存疑校核结果情况时，共 1 个存疑图斑，命名校核共标记 1 处校核点，包括一个土体构型因命名调整发生变化的（漏变底）。。

针对土体构型的校核，通过校核点 4-3 确定该图斑土体构型为黏土-壤土-壤土-壤土且壤土在 16cm 处出现，符合三普土壤对于体的命名，故修改为黏体砂石灰性潮土。。

点位编号：4-3。

3、表格与文字描述对应不一致

|  |  |      |       |        |       |            |         |
|--|--|------|-------|--------|-------|------------|---------|
|  |  |      |       |        |       | 均砂壤石灰性潮土。  | 105433。 |
|  |  |      |       |        |       | 砂壤底黏石灰性潮土。 | 20578。  |
|  |  |      |       |        |       | 砂壤夹黏石灰性潮土。 | 3673。   |
|  |  |      |       |        |       | 砂壤体黏石灰性潮土。 | 540。    |
|  |  | 脱潮土。 | 2433。 | 壤质脱潮土。 | 1525。 | 均壤质脱潮土。    | 48。     |
|  |  |      |       |        |       | 壤底黏脱潮土。    | 322。    |
|  |  |      |       |        |       | 壤体黏脱潮土。    | 1143。   |
|  |  |      |       |        |       | 均黏壤脱潮土。    | 12。     |
|  |  |      |       | 砂质脱潮土。 | 908。  | 均砂壤脱潮土。    | 908。    |

脱潮土面积较小，绝大部分分布在南河头乡西南部，总面积为 2230 亩，占全县总面积的 0.13%。划分均黏壤脱潮土、均砂壤脱潮土、均壤质脱潮土、壤体黏脱潮土、壤底黏脱潮土五个土种。。

4、两份报告相关数据内容不一致。请核实是否正确

湿潮土已全部转变为典型潮土。。



▪ （五）推测制图。

献县推测制图点位共布设 1810 个，其中，三普剖面样点 24 个、二普图野外校核点位 127 个，拾取土壤类型典型虚点 1659 个。。

土地利用现状图/图元。

本次样点准备工作，采用三普剖面点位、三普野外校核点位以及通过上述方法一、二共同确定的土壤类型典型虚点。献县推测制图点位共布设 1655 个，其中，三普剖面样点 24 个、二普图野外校核点位 115 个，拾取土壤类型典型虚点 1516 个。

**5、MJ 字段面积请进行检查，所有涉及到辖区总面积报告、图、数据 要与三调土地利用数据一致。**

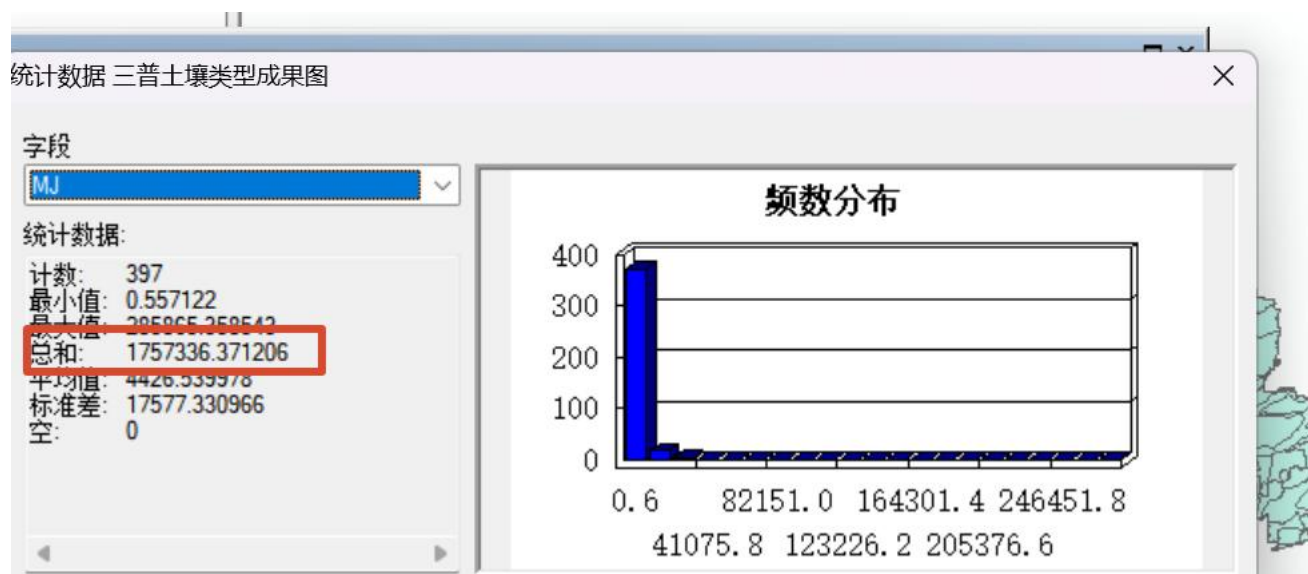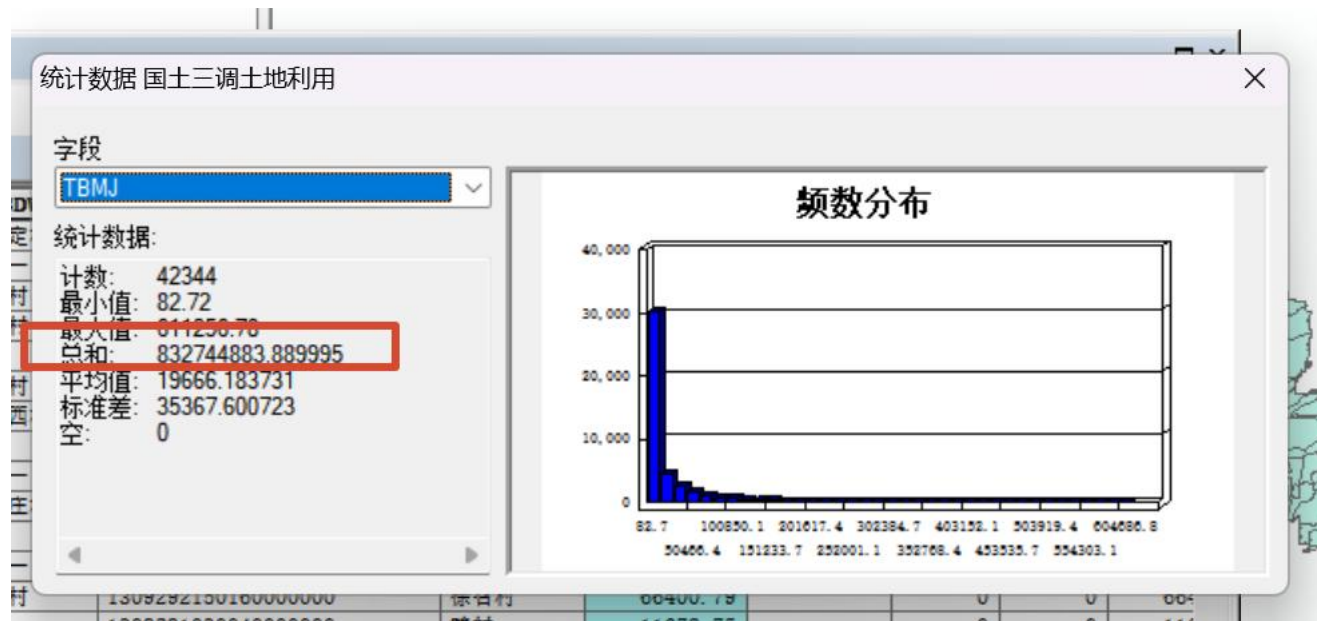



### 1.1 地理位置

献县，隶属于河北省沧州市，位于河北省东南部、沧州市西部，地处东经115°50′至116°30′、北纬38°3′至38°22′之间。东与沧县交界，西与武强、饶阳县连境，南与泊头市为邻，北与河间市、肃宁县接壤，北靠京津、东临渤海、南通中原、西接石家庄，距雄安新区不足80公里，是京津冀都市圈、环渤海经济圈重要组成部分。全县总面积1174平方公里，县政府驻乐寿镇。



### 第三部分 制图结果

**1、核查土壤三谱土壤类型成果图，字段部分空值，请全部核查**

检查完成

字段空值检查：共检查397个图斑的MJ、TL、YL、TS、TZ共5个字段，发现2个问题，已记录到格式检查字段

1. 338图斑 tl字段值为空
2. 338图斑 yl字段值为空
3. 338图斑 ts字段值为空
4. 399图斑 tl字段值为空
5. 399图斑 yl字段值为空
6. 399图斑 ts字段值为空

2、核查土壤三谱土壤类型成果图。图斑 ID379: 空间自相交, 关键点空间坐标是 [20419722.3984 4243466.687]。图斑 ID234 面积过小 (碎屑多边形), 面积:371.41 平方米

検査完成

几何有效性检查：共检查397个图斑，发现1个问题

1. 图斑ID379: 空间自相交, 关键点空间坐标是[20419722.3984 4243466.687]


**碎屑多边形检查:** 共检查397个图斑, 发现1个问题

2. 图斑ID234面积过小(碎屑多边形), 面积: 371.41 平方米


重疊检查：共检查397个图斑，零重疊

## 第四部分 图面表达

### 1、图面表达无地形信息（等高线），请补充

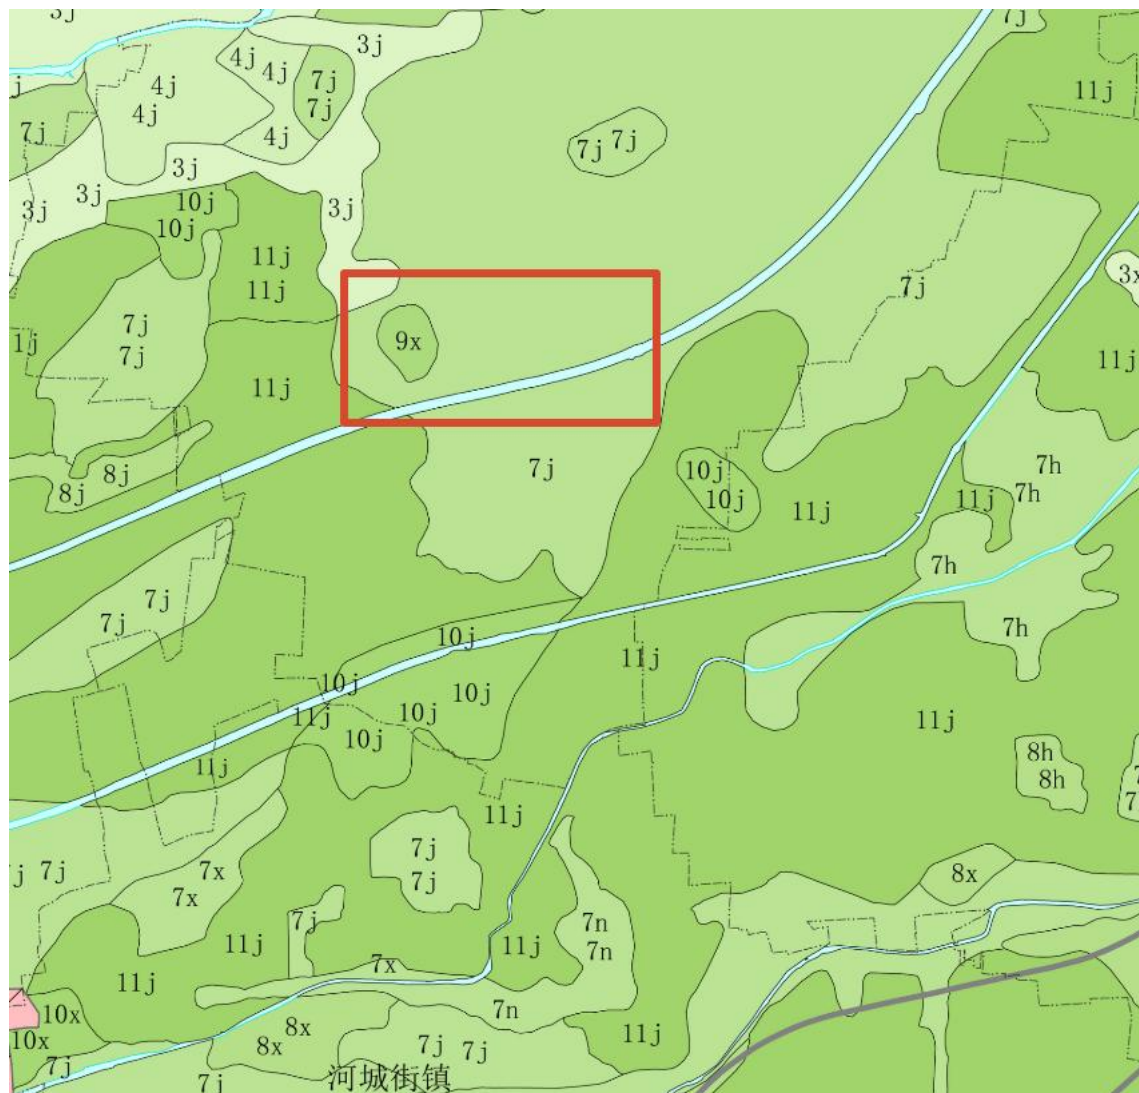

### 2、乡镇，地级行政界线不规范，请核查。请参考如下图

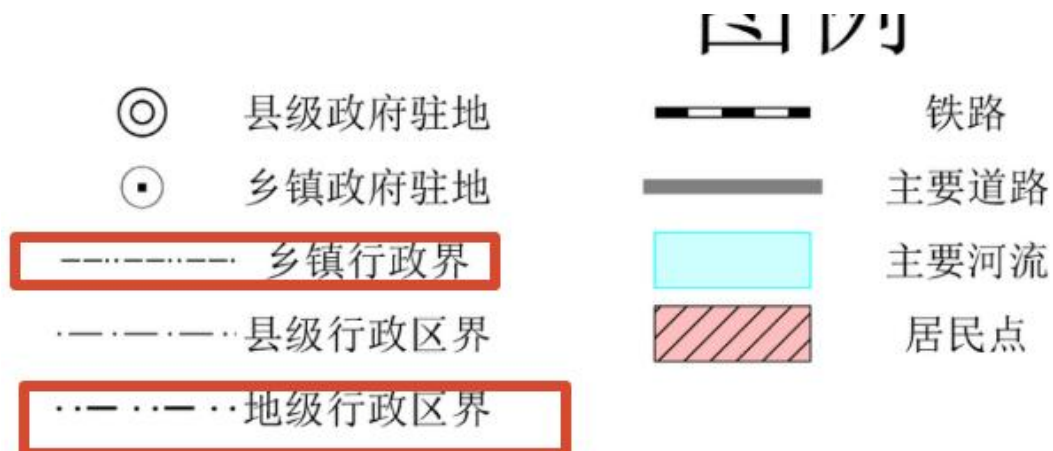


|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
| 未定国界       |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 省、自治区、直辖市界 |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 特别行政区界     |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 地级界        |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 县级界        |  | R0 G0 B0<br>C0M0Y0K100 |
| 乡、镇、街道界    |  | R77G73B72<br>C0M0Y0K80 |

### 3、缺少面积汇总


|           |       |        |       |        |       |        |      |        |     |       |
|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--------|-----|-------|
| 黏壤夾砂石灰性潮土 | 1717  | 28.19% | 3377  | 55.43% | 946   | 15.52% | 28   | 0.46%  | 25  | 0.41% |
| 均黏質石灰性潮土  | 13286 | 10.98% | 87252 | 72.13% | 18190 | 15.04% | 1635 | 1.35%  | 606 | 0.50% |
| 黏底砂石灰性潮土  | 130   | 16.22% | 591   | 73.99% | 53    | 6.66%  | 11   | 1.38%  | 14  | 1.75% |
| 黏夾砂石灰性潮土  | 2     | 0.44%  | 203   | 49.12% | 160   | 38.54% | 42   | 10.11% | 7   | 1.79% |
| 黏體砂石灰性潮土  | 6115  | 22.70% | 18202 | 67.58% | 2103  | 7.81%  | 292  | 1.08%  | 224 | 0.83% |
| 均砂壤脫潮土    | 191   | 24.89% | 311   | 40.59% | 262   | 34.22% | 0    | 0.00%  | 2   | 0.30% |
| 均壤質脫潮土    | 0     | 0.00%  | 6     | 35.94% | 10    | 64.06% | 0    | 0.00%  | 0   | 0.00% |
| 壤底黏脫潮土    | 43    | 15.37% | 209   | 74.37% | 25    | 8.93%  | 4    | 1.32%  | 0   | 0.00% |
| 壤體黏脫潮土    | 0     | 0.00%  | 667   | 68.63% | 302   | 31.04% | 2    | 0.16%  | 2   | 0.16% |
| 均黏壤脫潮土    | 9     | 94.14% | 0     | 0.00%  | 0     | 0.00%  | 1    | 5.86%  | 0   | 0.00% |

4、县、乡镇对应的式样在图例和图片中表示不规范，请参考如下图

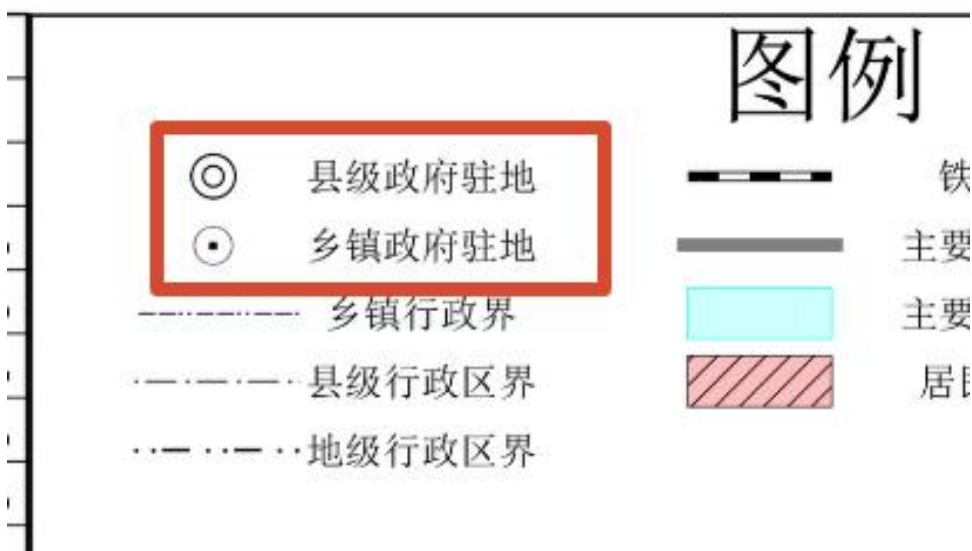





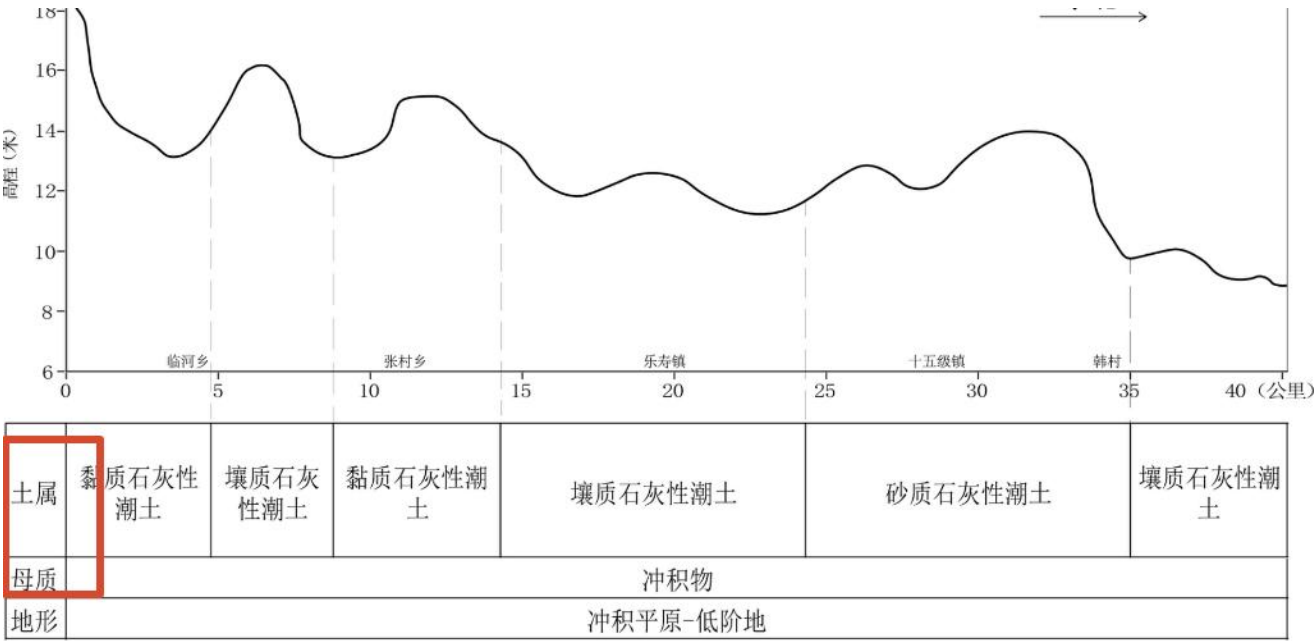

第五部分 报告质量

1、检查技术报告正文是否为单倍行距。通篇核查

1.1 地理位置

献县，隶属于河北省沧州市，位于河北省东南部、沧州市西部，地处东经115°50′至116°30′、北纬38°3′至38°22′之间。东与沧县交界，西与武强、饶阳县连境，南与泊头市为邻，北与河间市、肃宁县接壤，北靠京津、东临渤海、南通中原、西接石家庄，距雄安新区不足80公里，是京津冀都市圈、环渤海经济圈重要组成部分。全县总面积1174平方公里，县政府驻乐寿镇。

2、工作报告没有设有图、表目录

3、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。通篇核查

3、

第六部分 其他


1、自查表扫描件要求为：各自查表签字后按顺序合并为一个 PDF。而不是 excel 工作表

| 名称                 | 修改日期            | 类型                   | 大小   |
|--------------------|-----------------|----------------------|------|
| 二、基础数据             | 2026/6/1 0:30   | 文件夹                  |      |
| 六、汇报PPT            | 2026/6/1 0:31   | 文件夹                  |      |
| 三、过程数据             | 2026/6/1 0:29   | 文件夹                  |      |
| 四、成果数据             | 2026/6/1 0:31   | 文件夹                  |      |
| 五、地图文档包            | 2026/6/1 0:31   | 文件夹                  |      |
| 一、第三次全国土壤普查成果库.gdb | 2026/6/20 13:21 | 文件夹                  |      |
| 献县土壤类型图成果图自查表.xlsx | 2026/2/2 22:02  | Microsoft Excel 工... | 32 K |


2、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



3、数据库中缺少三普样点数据、校核前图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、预测不确定性分布图；推测土壤图应该放到 PROCESS；RESULT 多了

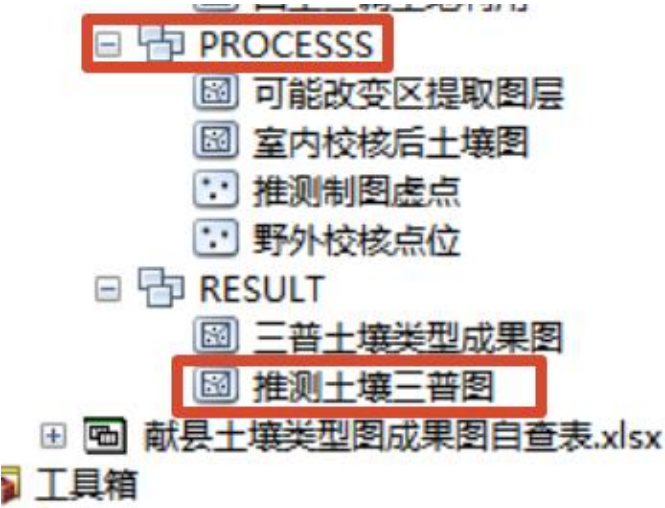


4、影像数据应该放到 2 成土环境数据文件夹下

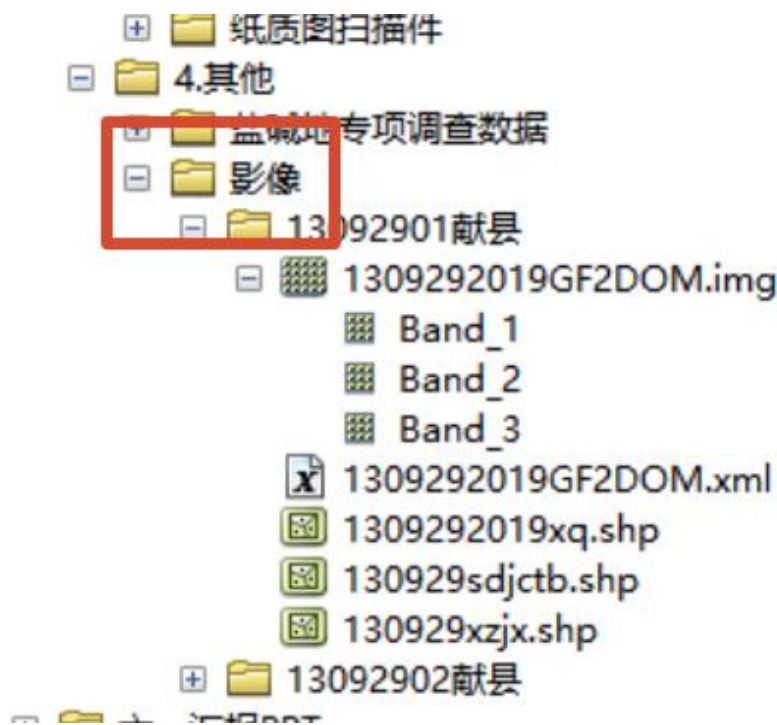

5、缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

| 名称                  | 修改日期             |
|---------------------|------------------|
| 献县二普-三普命名对应记录表.xls  | 2025/11/26 14:38 |
| 献县县级土种类型支撑剖面梳理.xlsx | 2025/12/26 13:50 |

6、缺少 layout 包，请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包。



7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

|      |       |      |                 |
|------|-------|------|-----------------|
| 质控意见 | 整改后通过 | 质控日期 | 2026 年 6 月 28 日 |
|------|-------|------|-----------------|
