

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	132982 沧州市任丘市	提交单位	河北图宇
--------	---------------	------	------

第一部分 土壤分类

1、未采用最新的 5 级分类

②土壤质地层位：土壤质地分为沙土、沙壤、轻壤、中壤、重壤、粘质（重壤以上）六级。表土质地不同划分土种。本着表层细分下层适当归并的精神，表土以下质地仅相差一级的也按均质土壤考虑，表层以下质地与表土相差两级或两级以上的作为间层，并根据间层厚度、层次划分土种。

2、省级清单中不含以下土壤类型：

任丘市技术报告

土属不存在（1 个）： 脱潮土

土种不存在（14 个）：

均壤质石灰性潮土（24 个图斑）

均壤质石灰性潮土（28 个图斑）

均黏壤石灰性潮土（1 个图斑）

壤夹黏湿潮土

壤夹黏石灰性潮土（1 个图斑）

壤底黏石灰性潮土（1 个图斑）

壤底黏石灰性潮（1 个图斑）

潮土典型潮土壤质石灰性潮土均壤质石灰性潮土

潮土典型潮土壤质石灰性潮土壤体黏石灰性潮土

潮土典型潮土壤质石灰性潮土壤夹黏石灰性潮土

潮土典型潮土壤质石灰性潮土壤底黏石灰性潮土

潮土典型潮土黏质石灰性潮土均黏壤石灰性潮土

潮土典型潮土黏质石灰性潮土均黏质石灰性潮土

潮土脱潮土壤质脱潮土壤底黏脱潮土

成组不存在（8 组）：

潮土 | 典型潮土 | 黏质石灰性潮土 | 潮土典型潮土黏质石灰性潮土均黏质石灰性潮土

潮土 | 典型潮土 | 黏质石灰性潮土 | 潮土典型潮土黏质石灰性潮土均黏壤石灰性潮土

潮土 | 典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 潮土典型潮土壤质石灰性潮土均壤质石灰性潮土
典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 潮土典型潮土壤质石灰性潮土壤底黏石灰性潮土
典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 潮土典型潮土壤质石灰性潮土壤夹黏石灰性潮土
典型潮土 | 壤质石灰性潮土 | 潮土典型潮土壤质石灰性潮土壤体黏石灰性潮土
脱潮土 | 壤质脱潮土 | 潮土脱潮土壤质脱潮土壤底黏脱潮土
潮土 | 典型潮土 | 黏质石灰性潮土 | 均黏壤石灰性潮土

任丘市工作报告

土种不存在（3 个）： 壤夹砂底粘石灰性潮土、壤夹黏底砂石灰性潮土、砂壤腰黏石灰性潮土

成组不存在（4 组）：

砂质石灰性潮土 | 砂壤腰黏石灰性潮土
壤质石灰性潮土 | 壤夹砂底粘石灰性潮土
壤质石灰性潮土 | 壤夹黏底砂石灰性潮土
黏质石灰性潮土 | 壤体砂石灰性潮土

第二部分 制图过程


- 1、明确阐述虚点的具体选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。
- 2、未深入在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及其对其合理性评述。过于笼统
- 3、推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图没有并选用了正确的图例
- 3、二普土壤图未进行地理配准
- 4、多种成果属性表字段命名极不规范请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

5、土壤类型图制图问题

空间拓扑检查	
检查完成	
7. 图斑ID236与图斑ID356存在重叠，重叠面积: 250.05 平方米	
8. 图斑ID342与图斑ID359存在重叠，重叠面积: 85.20 平方米	
9. 图斑ID342与图斑ID360存在重叠，重叠面积: 29.64 平方米	
缝隙检查：共检查373个图斑，发现2个问题	
10. 图斑ID41与图斑ID56之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0000 米	
11. 图斑ID174与图斑ID364之间存在缝隙，缝隙距离: 0.0000 米	


第三部分 制图结果

1、有不少规则图斑，疑似建成区，但是多块

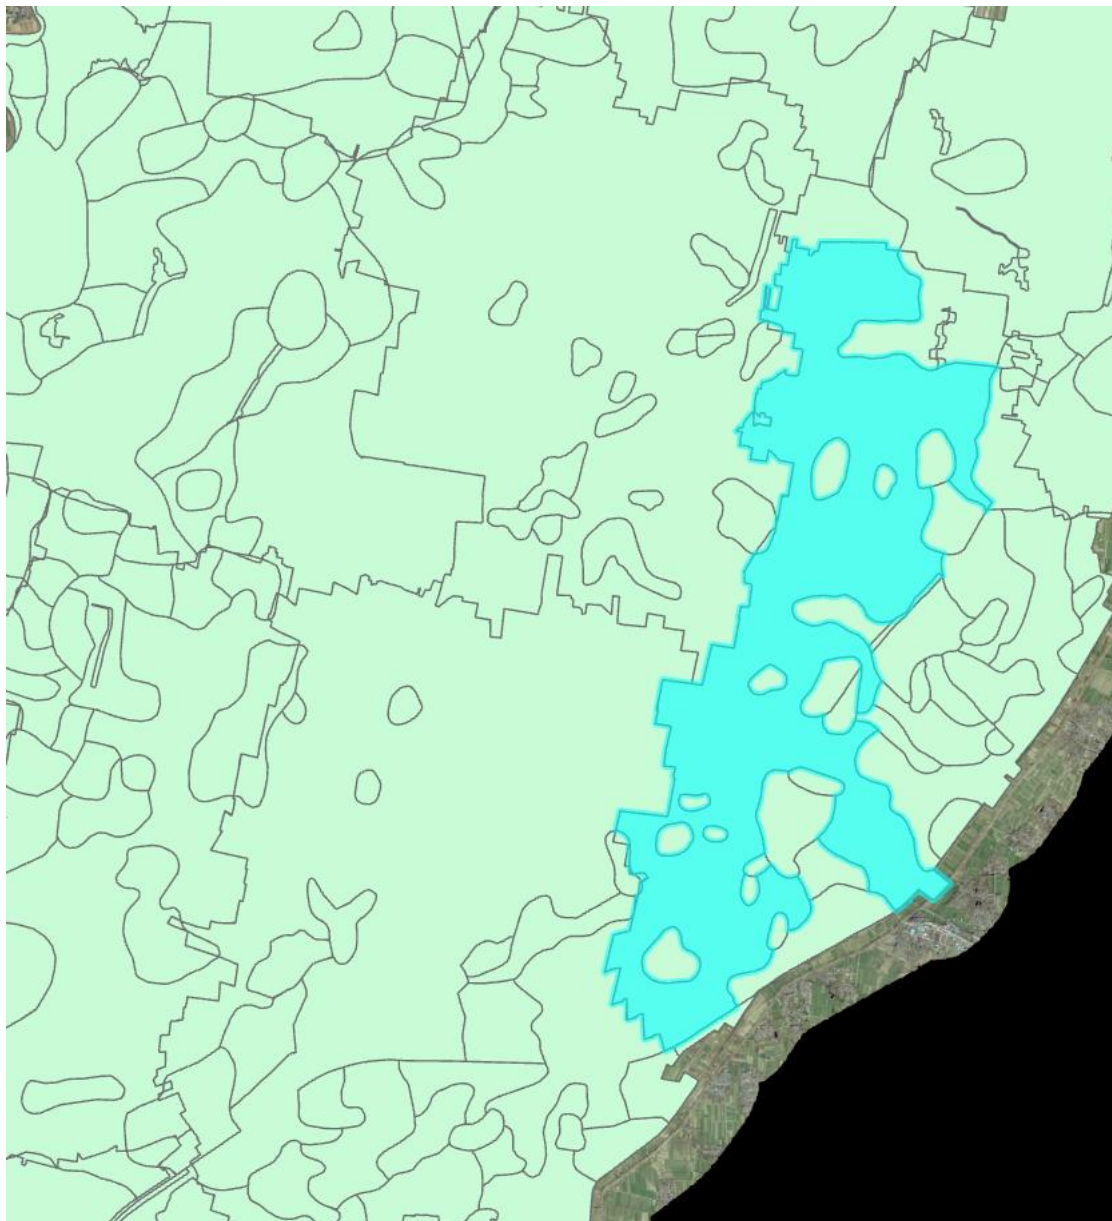


第四部分 图面表达

1、图面表达无地形信息（等高线），请补充

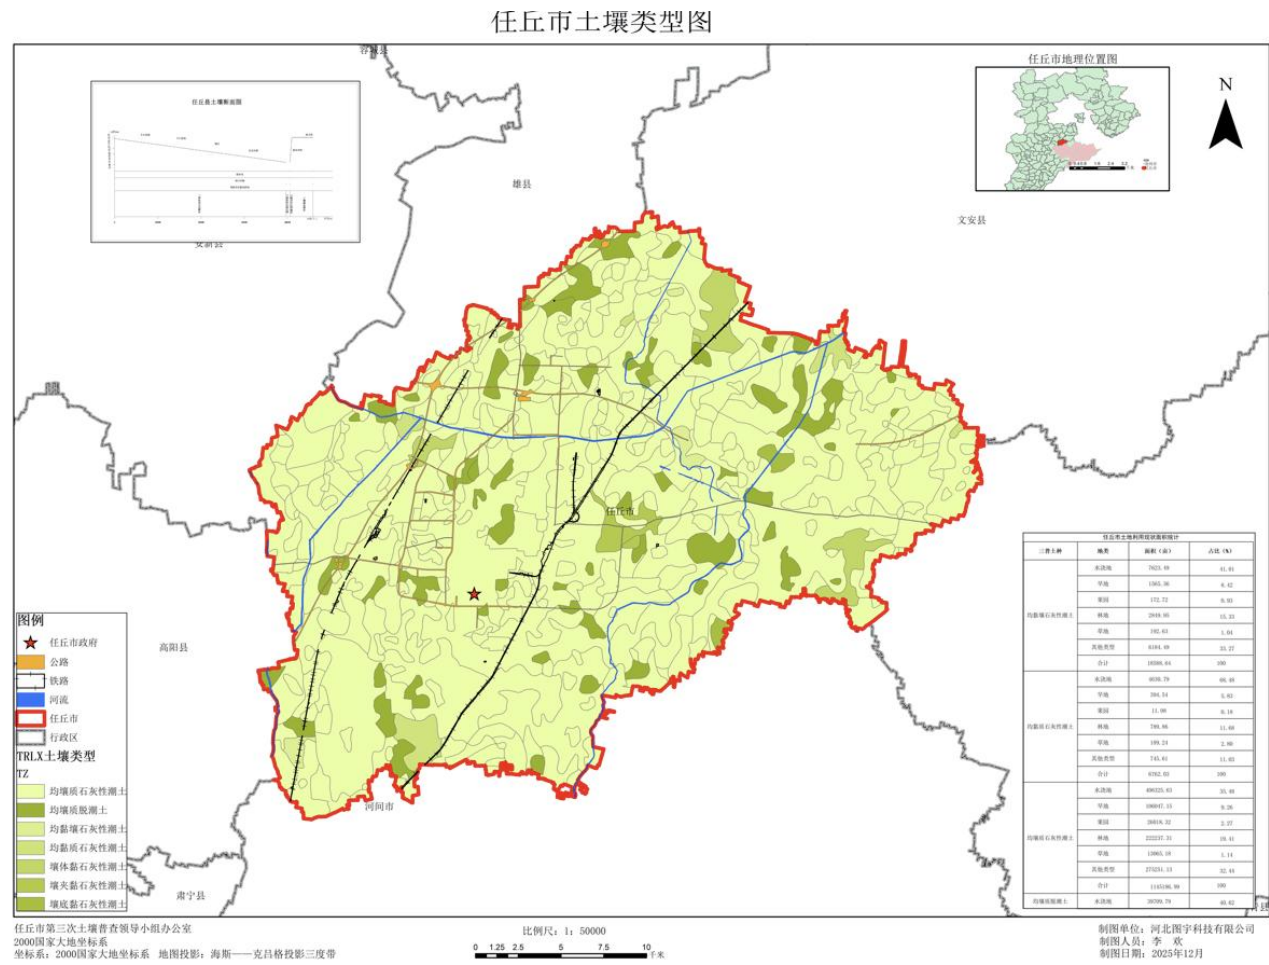


2、基础数据中所表示的道路，铁路以及河流等式样在图例中表示不规范。同时，三普土种图例表示也不规范，相关问题统一进行修改，正确式样请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制

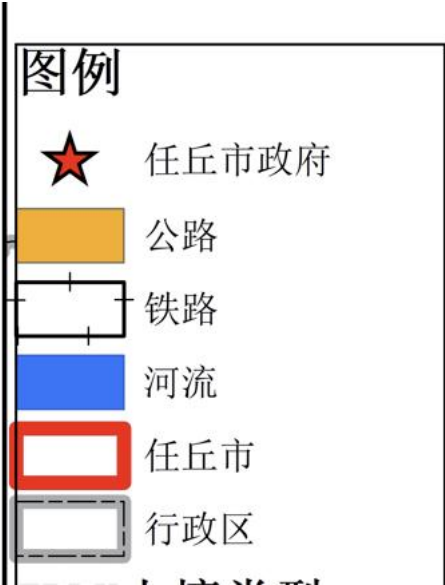


参考



3、未进行注记，且未体现农业利用状况

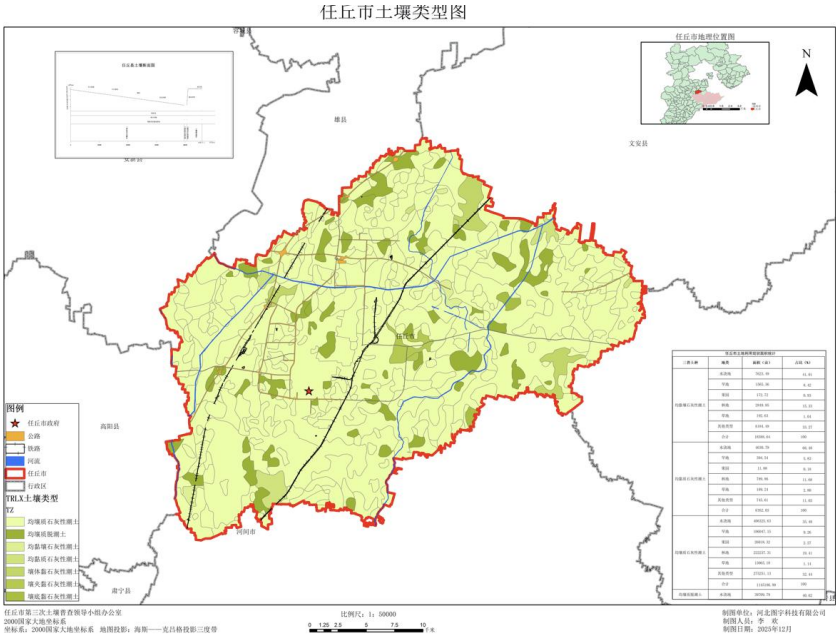

4、断面图问题太多：未标注断面方向；表格只写了具体内容，缺少行名；字体过小；垂直标记未将 关键位置 与 高程 的对应；布局不美观.....

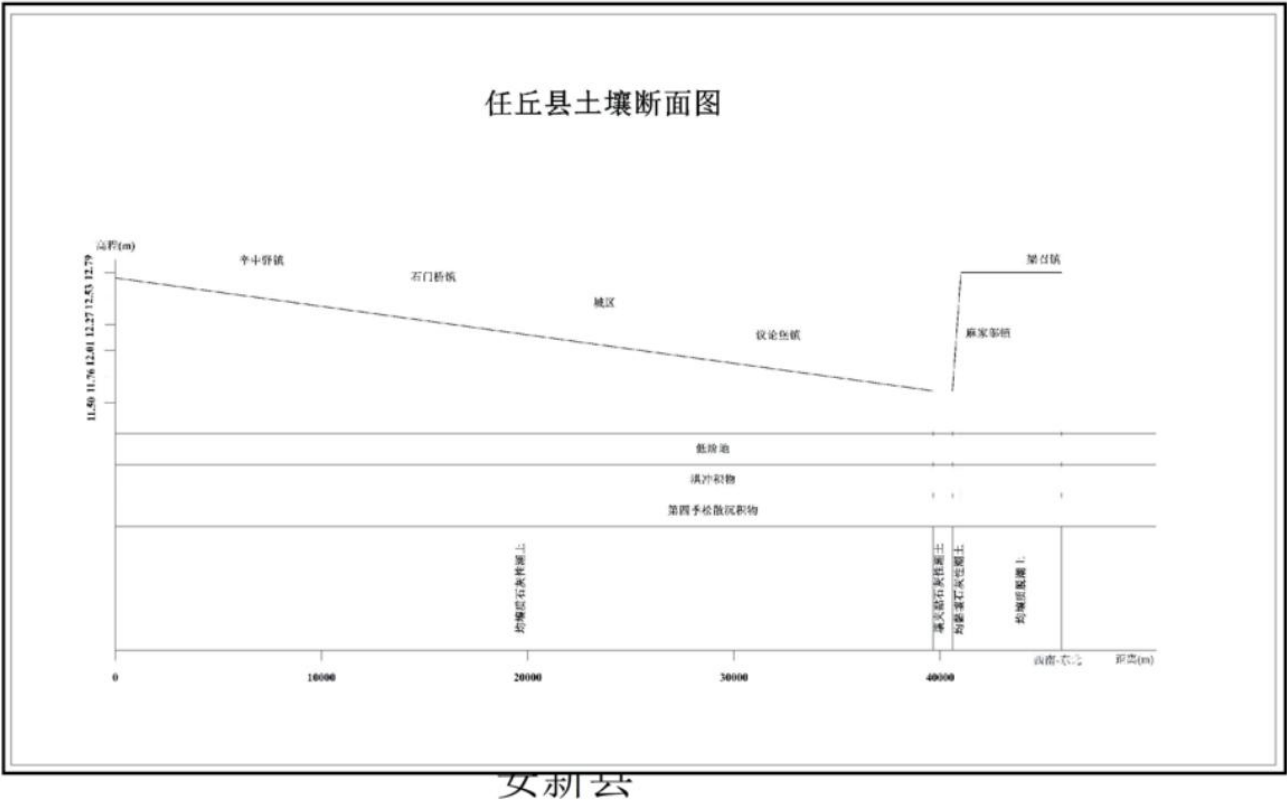

5、缺少面积汇总


	面积汇总表		
	合计	1145186.99	100
均壤质脱潮土	水浇地	39709.79	40.62

制图单位：河北图宇科技有限公司
制图人员：李 欢
制图日期：2025年12月

6、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



7、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标标注




8、面积统计表设计不合理，重复要素过多、占据位置太大

任丘市土地利用现状面积统计			
三普土种	地类	面积（亩）	占比（%）
均黏壤石灰性潮土	水浇地	7623.49	41.01
	旱地	1565.36	8.42
	果园	172.72	0.93
	林地	2849.95	15.33
	草地	192.63	1.04
	其他类型	6184.49	33.27
	合计	18588.64	100
均黏质石灰性潮土	水浇地	4630.79	68.48
	旱地	394.54	5.83
	果园	11.98	0.18
	林地	789.86	11.68
	草地	189.24	2.80
	其他类型	745.61	11.03
	合计	6762.03	100
均壤质石灰性潮土	水浇地	406325.63	35.48
	旱地	106047.15	9.26
	果园	26018.32	2.27
	林地	222237.31	19.41
	草地	13065.18	1.14
	其他类型	275251.13	32.44
	合计	1145186.99	100
均壤质脱潮土	水浇地	39709.79	40.62

参照

土种	旱地		水浇地		园地		林地		草地	
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比
均砂壤石灰性潮土	1098	24.15%	1490	32.77%	0	0.00%	1838	40.42%	121	2.67%
砂壤底黏石灰性潮土	2	0.47%	300	57.95%	1	0.25%	212	41.02%	2	0.31%
均壤质石灰性潮土	69313	13.66%	247398	48.77%	70854	13.97%	114902	22.65%	4783	0.94%
壤底黏石灰性潮土	19633	8.64%	115725	50.93%	36484	16.06%	54145	23.83%	1246	0.55%
壤底砂石灰性潮土	4758	14.48%	19003	57.82%	1400	4.26%	7231	22.00%	472	1.44%
壤夹黏石灰性潮土	3578	18.34%	9610	49.26%	1173	6.01%	5102	26.15%	44	0.23%
壤夹砂石灰性潮土	136	18.67%	451	61.99%	20	2.71%	75	10.30%	46	6.33%
壤体黏石灰性潮土	22658	5.86%	233564	60.36%	48215	12.46%	80461	20.79%	2028	0.52%
壤体砂石灰性潮土	1297	22.55%	2503	43.51%	210	3.65%	1729	30.05%	15	0.25%
均黏壤石灰性潮土	56	6.52%	631	73.42%	137	15.98%	24	2.75%	11	1.33%
均黏质石灰性潮土	1881	38.62%	2570	52.76%	17	0.34%	387	7.95%	16	0.32%

9、建成区未扣除

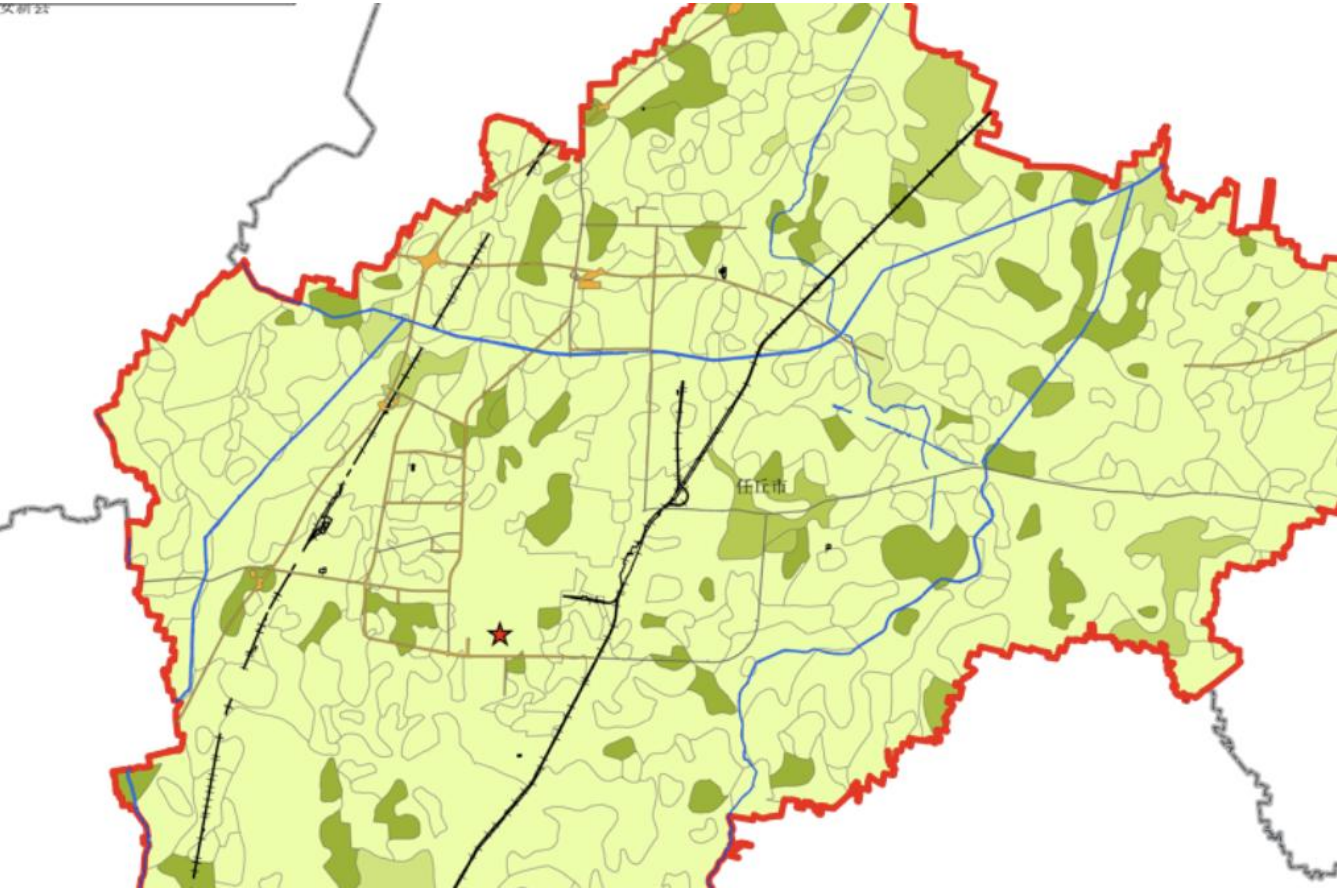

第五部分 报告质量


- 1、土壤分层单位统一为 cm，不通过：技术报告 P717/P719 中使用"厘米"（中文表述），如"1 米深考虑"、"20-50 厘米"、"大于 50 厘米"；P828-P829 使用"cm"（如"0-20cm 土层"）。同一文档内存在中文与符号混用。位置：技术报告第二章 2.2 土壤分类历史沿革、3.2 土壤类型变化
- 2、土地面积单位为亩时保留到整数 不通过 多处面积数值未保留整数。例如：P961 表 44"黏质石灰性潮土"面积为"291711.03"（亩）；P904 表 7 中"均黏壤石灰性潮土"面积为"6762.06"；P908"均壤质石灰性潮土"面积为"1145192.72"。位置：技术报告第三章 3.1、第四章 4.7.2
- 3、目录表示不清楚，要写清楚是表目录和图目录

目 录

表 1 任丘市土地利用现状	12
表 2 任丘市各类土壤利用面积统计	14

4、目录中图片的顺序与文字叙述中的顺序对应不上。请进行调整

点城市

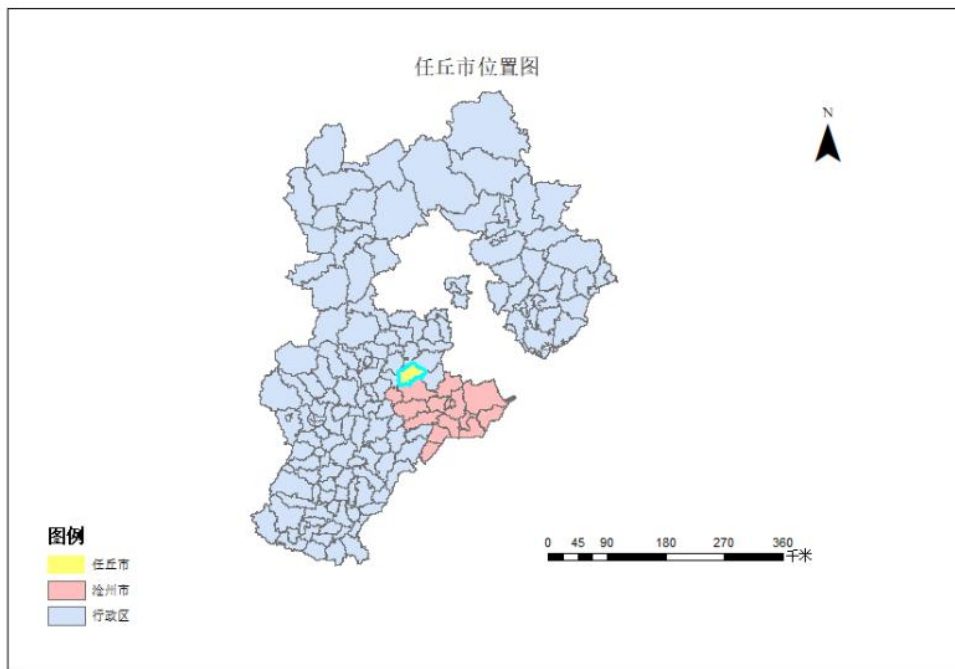

任丘市地理位置图

5、图、表编号混乱

6、工作报告没有图、表目录

7、请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体。标题段前段后是否各 0.5 倍行距。正文是否为小四号宋体，图名、表名五号黑体，正文是否为单倍行距。全文涉及的数字及英文字母是否一律用 Times New Roman 字体，通篇核查

一、前言。	
（一）土壤类型与制图工作背景。	
河间市位于河北省中南部，沧州市西北部，距沧州市 78 千米。北与任丘市、大城县交界，南与献县相连，西与高阳县、河间市相邻，东与青县、沧县接壤。市境地处东经 115° 55′ 至 116° 37′ 与北纬 38° 19′ 至 38° 39′ 之间，总面积 1322.44 平方千米。	
河间市第二次全国土壤普工作，在省、地土壤普查办公室的具体指导和县政府、县区划委员会的直接领导下，于一九八四年三月份开始到一九八五年三月底结束历时十三个月的时间。全县 90 各农业技术人员和 1900 各基层干部、群众投入了这项工作。经过野外调查、挖掘剖面，评土比土座谈访问，基本摸清了我县土壤资源和土地利用现状，以及农业生产上的物利因素障碍因素，为因地制宜合理利履和规化土地以及种植之布局。经过土壤普查，共挖掘次要剖面 28433 个，主要剖面 437 个（其中典型剖面 55 个），采集耕层土样 2005 个。典型剖面土样 265 个。微量元素土样 136 个。全县土壤划分为 2 个土类，6 个亚类，12 个土	

8、技术报告目录不规范，请调整其他地方也是，请完整检查并规范

1.2 成土环境	10
1.2.1 母岩母质	10
1.2.2 水文地质	10
1.2.3 植被状况	11
1.3 地形地貌	11
1.4 气候条件	11
1.5 土地利用状况	12

参照

第一章 县域概况	
1.1 地理位置	
1.2 成土环境	
1.2.1 气象气候	
1.2.2 水资源	
1.2.3 地形地貌	
1.2.4 植被	
1.2.5 母岩母质	
1.3 土地利用状况	

9、全文存在多处数据、表述不一致问题，属于严重低级错误，后续国家级验收当中容易出现一票否决情况，请通篇检查并修正；以下供你参考：

10、字体、字号、加粗、间距、标题等格式问题，请通篇检查并修正；请通篇检查完全重复的表格，判断是否有必要保留；目录设置有很大问题，不符合省里的要求.....

11、环境变量重要性排序及合理性评述 不通过 **P1170 提到"环境变量的选取原则"，表 18 列出了环境因素变量，但未见对环境变量重要性排序的专门论述和合理性评述。位置：技术报告 4.6 节**

12、推测制图效果评述且突出最优和最劣情况 未明确 在已读范围内，推测制图结果分析（4.6.4 节）的内容较少，未见明确的最优和最劣情况分析

13、推测制图虚点选择原则和代表性证明 不通过 查阅全文（P1800-2000 范围含推测制图内容），推测制图部分提及了训练样本准备（4.6.1），但未见明确的"虚点"概念阐述，未给出虚点选择原则及对土壤类型代表性的证明示例。位置：技术报告 4.6 节

14、室内校核结果量化和效用阐述 部分通过 P1467-P1471 概述了室内校核原则和方法，P1498 提到"补充了 16 个土种信息"、"边界初步纠偏 9 个图斑"，但缺乏整体量化的分项统计（如校核了多少图斑、各类问题数量汇总等）。位置：技术报告 4.3 节

15、图目录 不通过 工作报告中未见独立的图目录页面（在已读取的 563 段落中未发现）

16、表目录 不通过 工作报告中未见独立的表目录页面

17、土壤分层单位统一为 cm 不通过 工作报告 P462 中"30cm 以下"使用 cm，而部分描述使用中文"米"，存在混用。位置：工作报告 五、土壤普查工作有关建议

18、面积为亩时保留到整数 不通过 与技术报告相同，面积数据保留了小数，如"18588.73"、"6762.06"。位置：工作报告 第三章

19、章节标题规范 因格式信息缺失，无法准确判断 工作报告由于从.doc 转换，格式标注较少，标题级别信息不完整。从样式标记看部分标题有 heading 标记

20、一级/二级/三级/四级标题字体规范 因格式信息缺失，无法准确判断 同上

21、"质量控制"是否单独列为二级标题，独立成章节 不通过 在已读取的工作报告全文（563 段）中，未发现"质量控制"作为独立二级标题出现。质量控制内容可能融合在其他章节中。位置：工作报告全文

22、奇怪符号检查 不通过 技术报告 P722 行末出现多余的右括号"))": "【对齐:center

23、同一文档前后文内容一致性

24、检查项 状态 说明

25、二普亚类数量前后不一致 不通过 技术报告 P620 称二普"5 个亚类（典型潮土、褐土化潮土、盐化潮土、沼泽化潮土、黏质沼泽土）"；P731 表 3 中二普亚类列出"潮土、盐化潮土、普通潮土、脱潮土、褐化潮土"共 5 行，但内容不同（多了普通潮土和脱潮土，少了沼泽化潮土和黏质沼泽土）。位置：技术报告第二章 2.1.2 vs 表 3

26、二普土种数量不一致 不通过 技术报告 P620 和 P577 称"72 个土种"；P2409 称"32 个土种"。两处数据差异巨大（72 vs 32），可能 72 是二普土壤志原始数量，32 是二普矢量图中的数量，但文中未做解释区分。位置：技术报告第二章 2.1.2 vs 第四章 4.7.3

27、三普土种面积数据不一致 不通过 "均黏质石灰性潮土"面积在 P896 表 7 为"18588.73"，在 P1652 表 44（第四章分布表）为"291711.03"，差异极大。经比对分析，表 7 中的 18588.73 与提取文本末尾纯表格区域一致，而表 44 中的 291711.03 疑为黏质石灰性潮土整个土属的面积（包含均黏质和均黏壤），与表名不符。位置：技术报告第三章表 7 vs 第四章表 44

28、"脱潮土"章节编号跳跃 不通过 技术报告 P1876 为"5.6 壤质脱潮土的改良与利用"，P1878 直接跳到"5.8 保护土壤生态体系"，缺少 5.7 节。位置：技术报告第五章

29、文字错误 不通过 P1848 文字"根据表层质地和石灰性分为壤质石灰性潮土、黏质石灰性潮土潮土、砂质石灰性潮土壤质脱潮土"，明显缺少顿号分隔且"潮土"重复（"石灰性潮土潮土"）、"砂质石灰性潮土壤质脱潮土"两个名称连写。位置：技术报告第五章 5.1

30、P708 文字"卫位较高"应为"部位较高"；"彤响"应为"影响"。位置：技术报告第二章 2.2.1

31、P2000"地势地平部位"应为"地势低平部位"。位置：技术报告第四章 4.7.2

32、表编号重复 不通过 表 3 在 P627 和 P731 分别出现，内容不同（一个为二普分类体系，一个为二普与三普对照表）。表 9 在 P805 和 P958 分别出现（一个为土属对照，一个为土属命名规则变化）。位置：技术报告第二章

33、两个文档中相关内容一致性

34、检查项 状态 说明

35、二普亚类数量不一致 不通过 技术报告 P2409 称二普"3 个亚类"；工作报告末尾表格（P526-P531）称二普"5 个亚类"。两者数据不一致。位置：技术报告 4.7.3 vs 工作报告第三章表格

36、二普土种数量不一致 不通过 技术报告 P2409 称二普"32 个土种"；工作报告 P531 称二普"72 个土种"。位置：技术报告 4.7.3 vs 工作报告第三章表格

37、土属数量不一致 不通过 技术报告 P2409 称二普"11 个土属"；工作报告 P530 称"10 个土属"。位置：技术报告 4.7.3 vs 工作报告第三章表格

38、三普土属对照不一致 不通过 技术报告表 5（P805）中序号 3"沙壤质潮土"对应三普"砂质潮土"；工作报告表格（P543-P548）中"沙壤质潮土"对应的列为空，"沙质潮土"（工作报告新增的土属名）对应"砂质石灰性潮土"。两份文档的土属对照结果不一致。位置：技术报告表 5 vs 工作报告第三章

39、土种名称对照不一致 不通过 工作报告 P553 列出"沙质潮土"对应三普"均砂质石灰性潮土"，但技术报告的三普土种表（P883-P934 表 7）中并不包含"均砂质石灰性潮土"这个土种，技术报告三普仅有 7 个土种（均黏质/均黏壤/均壤质/壤底黏/壤体黏/壤体黏/均壤质脱潮土），不包含砂质相关的土种。位置：工作报告第三章 vs 技术报告第三章表 7


- 40、建议内容一致性 基本通过 两份报告的建议部分内容高度相似甚至部分段落几乎相同（如"人误地一时，地误人一年"段落、保护土壤生态体系段落），但技术报告建议更详细（分 5.1-5.8 多节），工作报告相对精简
- 41、内容完全重复的表格
- 42、检查项 状态 说明
- 43、重复表格检查 不通过 提取文本中发现多组完全重复的表格内容：1. "三普土种信息一览表"（含 7 个土种面积数据）在技术报告正文中以 docx 表格格式出现（P883-P934），在提取文本末尾以纯文本格式重复出现（P2060-P2069）；2. "环境因素变量数据"表在 P1411-P1438 和 P2213-P2223 出现两次；3. "土壤类型改变情况统计表"在 P1536-P1293 和 P2289-P2297 出现两次；4. "二普三普土类亚类对照表"在 P731-P749 和 P2072-P2075 出现两次。这些重复可能来自 docx 中图表嵌入的多重引用或提取过程中的重复。位置：技术报告全文多处

第六部分 其他

1、缺少自查表扫描件。自查表扫描件要求为：各自查表签字后按顺序合并为一个 PDF

名称	修改日期	类型
二、基础数据	2026/6/1 0:39	文件夹
六、汇报ppt	2026/6/1 0:39	文件夹
三、过程数据	2026/6/1 0:37	文件夹
四、成果数据	2026/6/1 0:39	文件夹
五、地图文档	2026/7/1 19:22	文件夹
一、第三次全国土壤普查成果库.gdb	2026/7/2 19:49	文件夹

2、缺少预测/推测不确定性分布图。推测的土壤三谱图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。



2、其他非矢量过程数据中缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

名称
 二三普土种转换对照表.docx
 任丘0807选点核.xls
 任丘市土壤二普三普分类对照.doc
 任丘市土壤发生分类.doc
 任丘土种类型支撑剖面梳理2025.xls

3、缺少 layout 包、地图文档（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

沧州市 > 河北图宇 > 3-132982沧州市任丘市(1) > 五、地图文档

名称	修改日期	类型	大小
 公路.dbf	2026/3/26 11:04	DBF 文件	1 KB
 公路.prj	2026/3/26 11:04	PRJ 文件	1 KB
 公路.sbn	2026/3/26 11:04	SBN 文件	1 KB
 公路.sbx	2026/3/26 11:04	SBX 文件	1 KB
 公路.shp	2026/3/26 11:04	SHP 文件	220 KB
 公路.shp.xml	2026/3/26 11:04	Microsoft Edge HT...	17 KB
 公路.shx	2026/3/26 11:04	SHX 文件	1 KB
 河流.dbf	2026/3/26 11:04	DBF 文件	243 KB
 河流.prj	2026/3/26 11:04	PRJ 文件	1 KB
 河流.sbn	2026/3/26 11:04	SBN 文件	3 KB
 河流.sbx	2026/3/26 11:04	SBX 文件	1 KB
 河流.shp	2026/3/26 11:04	SHP 文件	212 KB
 河流.shp.xml	2026/3/26 11:04	Microsoft Edge HT...	1 KB
 河流.shx	2026/3/26 11:04	SHX 文件	3 KB
 任丘市政府.dbf	2026/3/26 11:04	DBF 文件	1 KB
 任丘市政府.sbn	2026/3/26 11:04	SBN 文件	1 KB
 任丘市政府.sbx	2026/3/26 11:04	SBX 文件	1 KB

4、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 2 日
------	-----	------	----------------
