

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	石家庄市	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	------	------	------------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该亚类/土属/土种或土壤类型组合与省级分类清单不一致；以下文本信息为报告中筛查出的不存在与省级清单中的情况，仅供参考，请全部核查

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 103 个问题
2. 图斑 20：省级分类清单无该亚类
3. 图斑 21：省级分类清单无该亚类
4. 图斑 34：省级分类清单无该土种
5. 图斑 38：省级分类清单无该土属
6. 图斑 40：省级分类清单无该亚类
7. 图斑 290：省级分类清单无该土种

亚类不存在（2 个）：

典型灌淤土

石灰性潮土

土属不存在（7 个）：

泥砂质典型褐土

潮壤土

潮砂土

灌淤土

石灰性褐土

脱潮壤土

黄土质潮褐土

第二部分 制图过程

第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图.图斑 ID430：空间自相交，关键点的空间坐标是
[38557580.5117 4209534.8074]。图斑 ID14 与图斑 ID450 之间存在缝隙，缝隙距离: 0.4103 米


几何有效性检查：共检查710个图斑，发现1个问题	
1.	图斑ID430：空间自相交，关键点 的空间坐标是 [38557580.5117 4209534.8074]
碎屑多边形检查：共检查710个图斑，未发现碎屑多边形	
里置检查：共检查710个图斑，零里置	
缝隙检查：共检查710个图斑，发现1个问题	
2.	图斑ID14与图斑ID450之间存在缝隙，缝隙距离: 0.4103 米
重复几何检查：共检查710个图斑，未发现重复几何	

第四部分 图面表达

1、成图比例尺：1： 5 万，图中比例尺 1： 250000，请修改



2、图面表达无地形信息（等高线），请补充

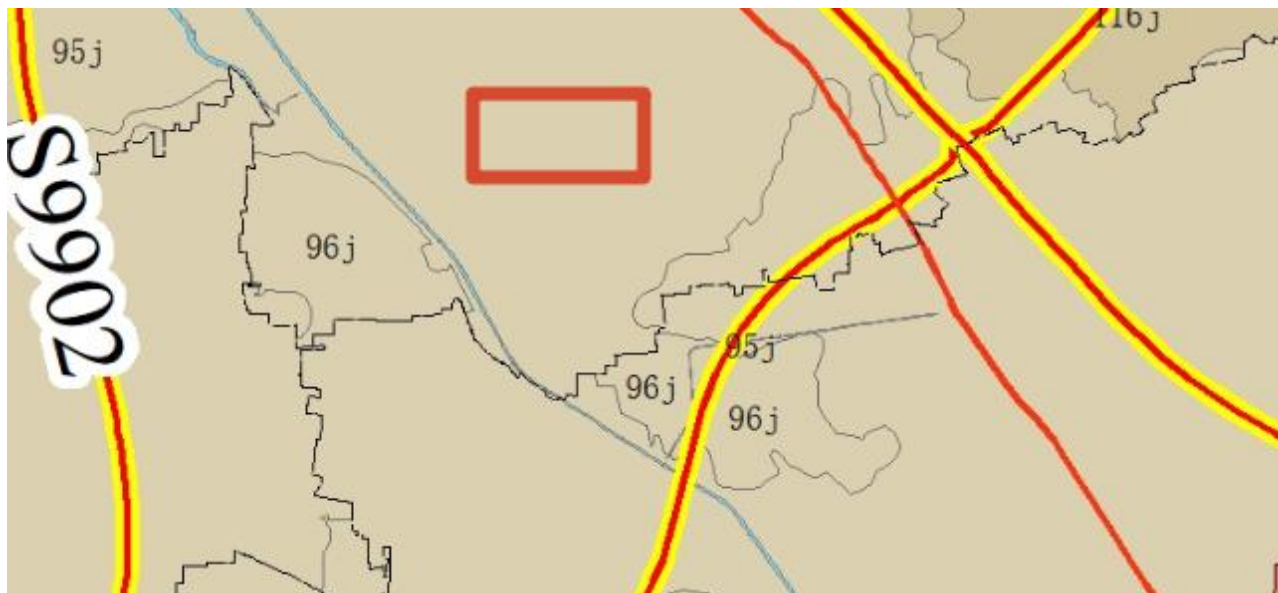

3、图例中县级行政中心，乡镇级行政中心，居民点，乡镇界限等式样在图例以及图片中表示不规范。正确式样请参照《第三次全国国土调查技术规程》（TD/T1055-2019）进行背景要素符号样式设计和绘制


		图例 ⊙ 县级行政中心 □ 县级行政区 - 省道 - 国道 - 高速公路 - 铁路 - 河流水系 - 居民点	

未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

4、缺少面积汇总

褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土	19342	75.67%	728	2.85%	928	3.63%	90	0.35%	4472	17.50%	124	壤底黏泥砂
	壤夹姜泥砂质潮褐土	119	99.17%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1	0.83%	125	壤质中层暗
	壤夹黏泥砂质潮褐土	22	1.73%	977	76.99%	0	0.00%	39	3.07%	231	18.20%	126	壤质中层暗
	壤夹砂泥砂质潮褐土	136	45.64%	0	0.00%	9	3.02%	0	0.00%	153	51.34%	127	壤质中层泥
	壤体姜泥砂质潮褐土	87	67.44%	2	1.55%	0	0.00%	0	0.00%	40	31.01%	128	壤质中层灰
	壤体黏泥砂质潮褐土	92	32.62%	0	0.00%	47	16.67%	7	2.48%	136	48.23%	129	壤质中层硅
	壤体砾泥砂质石灰性褐土	1276	30.78%	252	6.08%	911	21.97%	613	14.79%	1094	26.39%	130	壤质中层磷
	壤体黏泥砂质潮褐土	1860	83.86%	16	0.72%	181	8.16%	0	0.00%	161	7.26%	131	壤质中层红
	壤体黏泥砂质石灰性褐土	863	67.53%	5	0.39%	183	14.32%	110	8.61%	117	9.15%	132	壤质中层麻
												133	壤质中层麻
												134	壤质中层黄
												135	壤质中层黄
												136	壤质厚层暗
												137	壤质厚层暗
												138	壤质厚层泥
												139	壤质厚层灰
												140	壤质厚层硅

5、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域

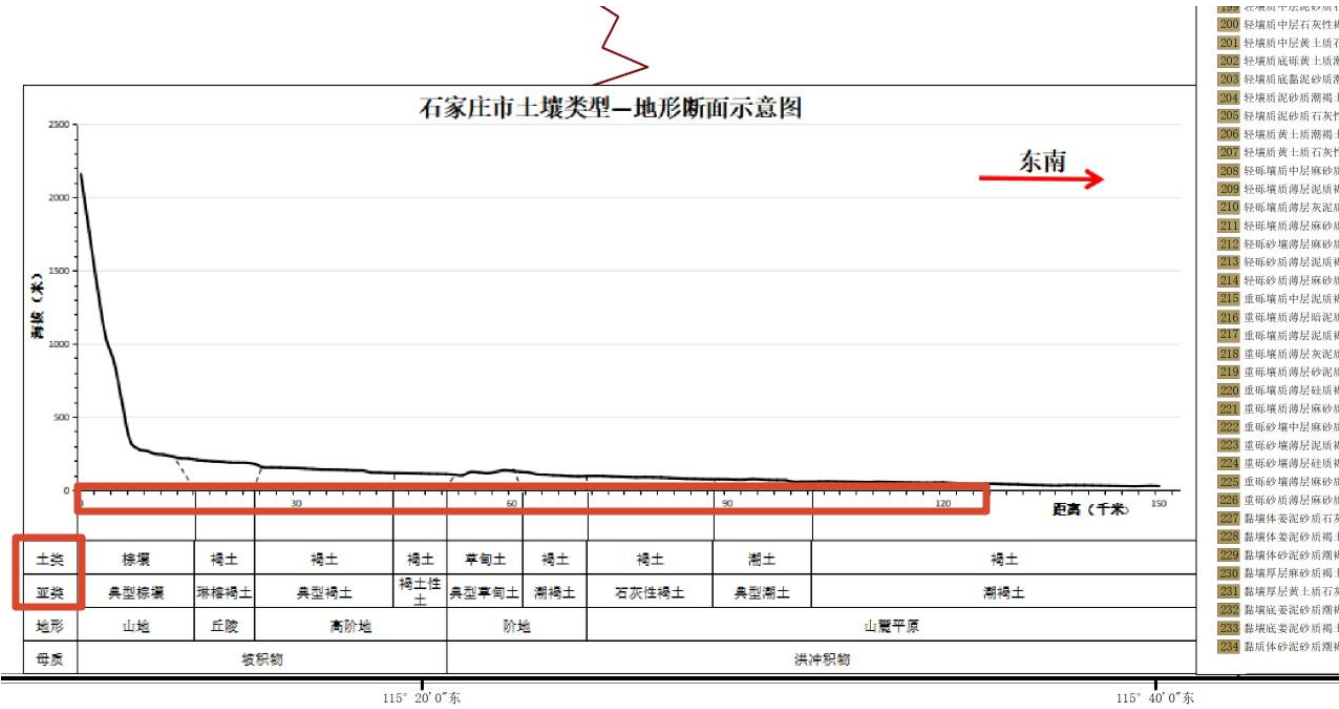


制图单位：河北高翔地理信息技术服务有限公司
制图人员：张惠旺

7、图廓直线表示不规范，应外粗内细



6、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图

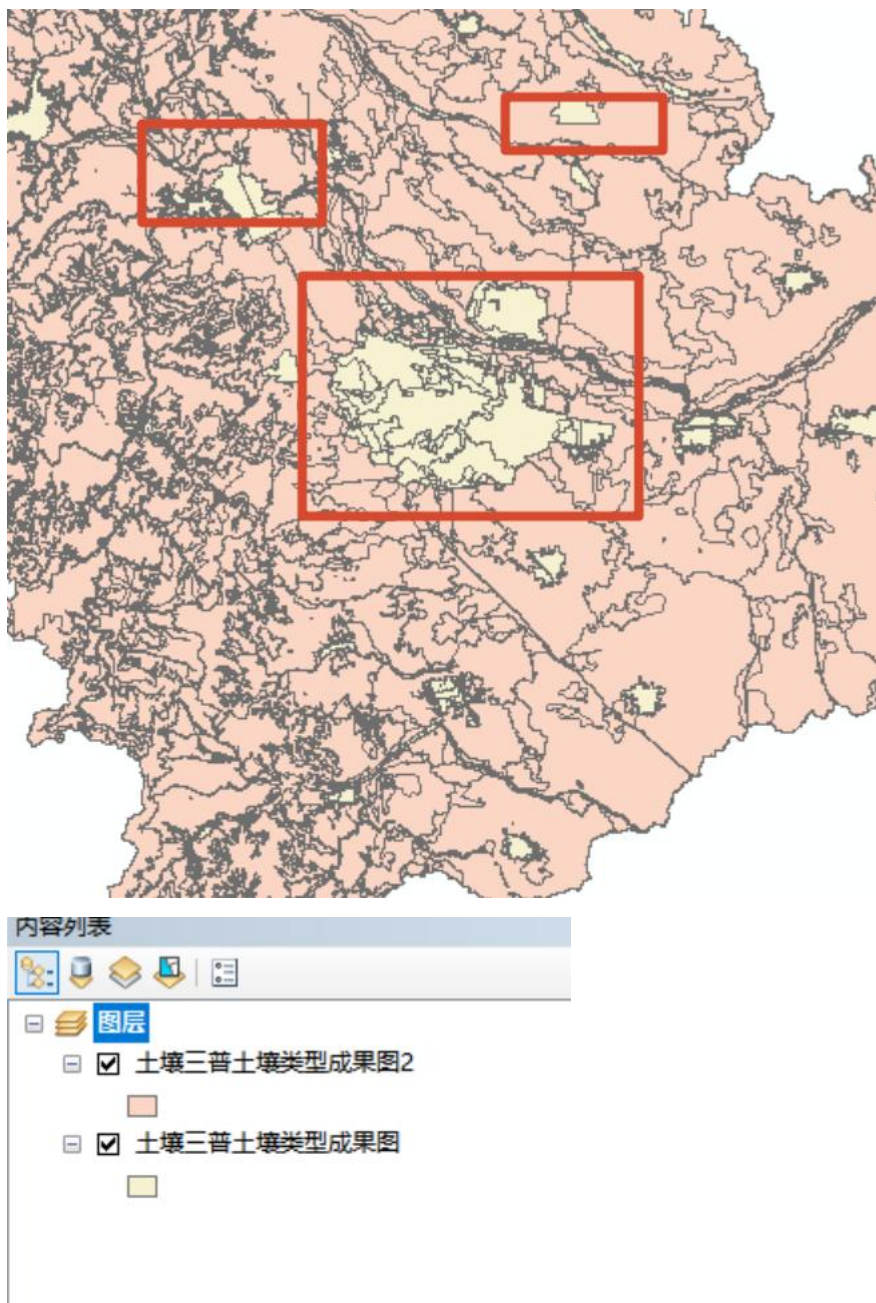

第五部分 报告质量

1、复制粘贴后未进行更改，导致表格和文字不对应。以下供参考，全文多处，请通篇检查

表 2-7（山地草甸土）表名错误 【严重】

原文：表 2-7 的表头写为“风沙土占比（占全市风沙土面积）%”（第 934 行），但该表实际内容为山地草甸土的分布数据（灵寿 36.78%，平山 63.22%）。

对应位置：“表 2-7 各区县山地草甸土占全市山地草甸土面积的比例表”（第 931 行）——表名正确但表头数据列名错误。

建议：将表头“风沙土占比”改为“山地草甸土占比（占全市山地草甸土面积）%”。

棕壤段落中错误使用“褐土”表述 【严重】

原文："从各区县占全市褐土面积的比例来看，井陘占比为 1.04%，灵寿占比为 20.91%，平山占比为 75.07%，赞皇占比为 2.98%。棕壤是市域内暖温带山地淋溶土..."（第 871 行）

此段描述的是棕壤的分布，但开头写成"占全市褐土面积的比例"，明显笔误。

建议：将"褐土"改为"棕壤"。

人工土段落中错误使用"褐土"表述【严重】

原文："从各区县占全市褐土面积的比例来看，行唐占比为 81.11%..."（第 891 行）

此段描述的是人工土的分布，但写成"占全市褐土面积的比例"。

建议：将"褐土"改为"人工土"。

草甸土描述中前后矛盾【中等】

原文第 843 行："主要集中在滹沱河主河道两侧河漫滩、低阶地（正定、藁城、无极段），以及洺河、槐河等支流浅滩和平原局部浅洼地"

但表 2-3（第 845-865 行）中草甸土分布区为：行唐、井陘、灵寿、平山、元氏、赞皇，表中无正定、藁城、无极。

文字描述与表格数据不一致。

建议：核实草甸土的实际分布，统一文字与表格数据。

图 4-4 标题与正文描述不一致【中等】

原文图 4-4 标题："拓扑存在问题示例图（灵寿县、鹿泉区）"（第 1461 行）

但正文表述："经全面校核，鹿泉区和元氏县拓扑存在问题"（第 1457 行）

图标题与正文不一致。

建议：核实实际存在拓扑问题的县区，统一图标题和正文描述。

2、单位问题，以下仅供参考，请通篇检查！

5.5 节中面积单位换算错误【严重】

原文："252hm²（3780 亩）"（第 1900 行）以及"252hm²（3780 亩）"（第 1904 行），这两处一致。

但第 1922 行："对应实地面积约 252km²"——此处 252km²=25200 公顷=378000 亩，与"252hm²（3780 亩）"差距 100 倍，252km² 明显是错误的，应为 252hm²。

建议：将"252km²"改为"252hm²"。

6.1 节中面积单位换算错误【严重】

原文："对应实地面积 252cm²（折合 3780 亩）"（第 1976 行）

252cm²是图上面积，不是实地面积。此处混淆了图上面积与实地面积，252cm²=0.0252m²，不等于 3780 亩。

建议：改为"对应实地面积 252hm²（折合 3780 亩）"，图上面积 0.4cm²对应实地面积 252hm²。

3、其他上下文不一致问题，以下仅供参考，请通篇检查！

6.3.1.1 节土属变化数据逻辑错误【严重】

原文："土类、亚类、土属数量分别减少 1 个、8 个、216 个、506 个"（第 2044 行）

此句有四个数字但仅对应"土类、亚类、土属"三个分类级别，多了一个数字"506 个"。从上下文看：

土类：二普 8→三普 9，增加 1 个

亚类：二普 27→三普 19，减少 8 个

土属：二普 279→三普 63，减少 216 个

土种：二普 748→三普 242，减少 506 个

原文缺少"土种"类别，且"土类"实际是增加而非减少。

建议：改为"土类数量增加 1 个，亚类、土属、土种数量分别减少 8 个、216 个、506 个"。

第七章结论中土属数量与第六章不一致【严重】

原文第六章 6.3 节："63 个土属，242 个土种"（第 2038 行）

原文第七章 7.1.1 节："64 个土属，242 个土种"（第 2754 行）

同一文档内土属数量前后不一致：第六章 63 个，第七章 64 个。

建议：核实并统一土属数量。

第七章土属列表中有重复项【中等】

原文第七章 7.1.1 中列出了 64 个土属，其中"壤质石灰性潮土"出现了两次（第 2754 行）：

"...壤质湿潮土、砂质湿潮土、壤质石灰性潮土、壤质草甸土..."（第一次）

"...壤质石灰性潮土、壤质草甸土..."（第二次）

这可能是导致第七章土属数量多出 1 个（64 而非 63）的原因。

建议：删除重复的"壤质石灰性潮土"，将总数修正为 63 个。

4、其他类型问题，以下仅供参考，请通篇检查！

"共个 9 个土类"语序错误（多处）【严重】

原文："石家庄市共个 9 个土类"（第 1980 行）

原文："明确目前石家庄市共个 9 个土类"（第 2038 行）

原文："明确目前石家庄市共个 9 个土类"（第 2754 行）

建议：改为"共 9 个土类"。

图 5-5 与图 2-3 使用同一张图【中等】

原文图 5-5：""（第 1968 行）——与图 2-3"石家庄市土壤类型分布图"（第 747 行）使用同一图片。

图 5-5 标题为"石家庄市非土壤处理后成果图"，应展示非土壤处理后的成果，但实际使用了未处理的原始土壤类型分布图。

建议：替换为实际的非土壤处理后成果图。

二普土种剖面点信息大量重复【轻微】

高邑县（第 475-477 行）、行唐县（第 485-487 行）、井陉县（第 495-497 行）、新乐市（第 517-519 行）、元氏县/新乐市（第 523-525 行）、赞皇县（第 529 行）等六个县区的二普剖面点收集信息描述几乎完全相同，均为"二普剖面点收集信息包含坐标位置、成土环境与土壤类型..."这段模板化文字。

建议：差异化描述或合并为统一说明，避免大量内容重复。

第三章中"广阳地区"表述错误【严重】

原文："是广阳地区土壤研究与管理的基础资料"（第 979 行）

本文为石家庄市技术报告，不应出现"广阳地区"（广阳为廊坊市辖区）的表述。

建议：改为"石家庄市"或"本地区"。

破折号长度不一致

4-22 根据二普纸质图划分边界示例（以正	
4-23 栾城——藁城野外校核相关照片	
4-24 栾城—元氏野外校核相关照片	
4-25 赵县—藁城野外校核相关照片	
4-26 正定—灵寿野外校核相关照片	
4-27 正定—新乐野外校核相关照片	

7.2.2.1 节标题为"典型褐土"但内容为"典型潮土"【严重】

原文目录（第 281 行）："7.2.2.1 典型褐土"

但该节内容（第 2816-2824 行）描述的全部是"典型潮土"的特征：

"典型潮土质地多样（从砂土到粘土均有分布）..."

"典型潮土土层深厚、质地适中..."

标题与内容不符，应为"7.2.2.1 典型潮土"。

建议：将标题改为"典型潮土"。

7.2.3.3 节"潜育草甸土"内容描述与标题不完全匹配【中等】

原文 7.2.3.3 标题为"潜育草甸土"（第 2876 行），但内容（第 2880 行）开头描述的母质、有机质特征等更接近"山地草甸土"的特征描述：

"母质多为硅质岩、碳酸盐岩风化物或黄土堆积。土体湿润，有机质累积强烈而分解缓慢。山地草甸土腐殖质层有机质含量在 50-100g/kg..."

内容中直接出现了"山地草甸土"字样，疑似内容错位。

建议：核实并替换为潜育草甸土的正确描述内容。

5、工作报告与技术报告不一致，以下仅供参考，请通篇检查并修正

1. 土属数量不一致【严重】

工作报告："明确目前石家庄市共 9 个土类，19 个亚类，63 个土属，242 个土种"（出现两处，分别在第四章和第五章）

技术报告第七章结论：明确"石家庄市共 64 个土属"（多处一致为 64 个土属），且第七章列出了 64 个土属的完整清单（如壤质石灰性潮土、潮砂土、脱潮壤土、黏质脱潮土、壤质石灰性潮土等均出现在技术报告 64 个土属清单中）

说明：工作报告两处均写作"63 个土属"，与技术报告结论的"64 个土属"不一致。且技术报告第六章 6.1 节写作"63 个土属"但第七章结论更正为"64 个土属"，工作报告应与技术报告最终结论（64 个土属）保持一致。

2. 二普-三普对比中"土类"变化描述错误【严重】

工作报告："土类：总数保持稳定，构成调整明显，新增人灌淤土 1 个土类。"

技术报告表 6-2：二普 8 个土类，三普 9 个土类，变化为"+1"；技术报告 6.3.1.2："土类总数保持稳定，但具体土类构成发生了明显调整。相较于二普，三普增加了一个灌淤土土类。"

说明：工作报告写"总数保持稳定"与自身数据矛盾（二普 8 个 vs 三普 9 个，增加了 1 个），且"新增人灌淤土"表述有误，应为"灌淤土"。

3. 二普-三普对比统计表逻辑错误 [中等]

工作报告："土类增加 1 个，亚类、土属、土种数量分别减少 8 个、216 个、506 个"

技术报告 6.3.1.1："土类、亚类、土属数量分别减少 1 个、8 个、216 个、506 个"（此句本身也有语病，但关键数字一致）

说明：工作报告表述"土类增加 1 个"正确，但紧接着写"亚类、土属、土种数量分别减少 8 个、216 个、506 个"，语序和逻辑混乱，"分别"连接的前面是"增加 1 个"后面是"减少"，容易引起歧义。技术报告中也有类似语病但统计表本身是清晰的。

4. 亚类减少表述中"草甸沼泽土"矛盾 [中等]

工作报告："三普减少了沼泽化潮土、沼泽土、盐化潮土、潜育型水稻土、碳酸盐褐土、潜育水稻土、沼泽草甸土**和草甸沼泽土"

技术报告 6.3.1.3 表 6-4：草甸沼泽土在三普中仍然存在（作为三普亚类列出），而二普的"草甸沼泽土"在三普中亚类列表也有出现。

说明：工作报告称三普"减少了草甸沼泽土"，但技术报告表 6-4 显示三普亚类中包含"草甸沼泽土"。需核实草甸沼泽土是否真正在三普中消失。根据技术报告表 6-4，二普的草甸沼泽土确实三普中也有对应，工作报告与技术报告自身在这一点上也存在矛盾。

6. 工作报告文字错误，以下仅供参考，请通篇检查并修正

5. "共个 9"语序错误 [严重]

工作报告（第四章）："明确石家庄市共个 9 土类，19 个亚类，64 个土属，242 个土种"

工作报告（第五章）："明确目前石家庄市共个 9 个土类，19 个亚类，63 个土属，242 个土种"

技术报告（第六章、第七章）也存在"共个 9 个土类"的错误

说明：应为"共 9 个土类"，"个 9"语序颠倒，属于明显笔误，两处均需修正。

6. "深泽市"应为"深泽县" [中等]

工作报告："高邑县、藁城区、行唐县、晋州市、井陉县、灵寿县、鹿泉区、平山县、深泽市、无极县、新乐市、元氏县、赞皇县、栾城区、石家庄市合并区、赵县、正定县"

说明：深泽县为石家庄市下辖县，并非县级市。应为"深泽县"。同一文件中其他位置（如表 4-1、图 5-9 名称等）均正确使用"深泽县"，此处属笔误。

7. "无极限"应为"无极县" [严重]

工作报告目录："[图 5-11 无极限三普土壤图 28]"

说明：图名"无极限"明显错误，应为"无极县三普土壤图"。正文中图名标注为"图 5-11 无极限三普土壤图"也是错的。

8. "灌淤土"用字不规范 [轻微]

工作报告："灌淤土"（多处出现）

技术报告同样使用"灌淤土"

说明：“淤”为繁体/异体写法，标准土壤分类名称应为“灌淤土”（淤积之淤）。建议统一改为规范用字“灌淤土”。

9. "灌淤土"与"人灌淤土"自相矛盾 [中等]

工作报告二普-三普对比部分：“新增人灌淤土 1 个土类”

工作报告第五章土壤类型：“灌淤土和沼泽土”

说明：同一文件中，前文写“人灌淤土”（多一个“人”字），后文写“灌淤土”，名称不一致。应为“灌淤土”。

7、工作报告上下文不一致问题，以下仅供参考，请通篇检查并修正

深泽县风沙土分布范围与技术报告不一致 [中等]


工作报告：“风沙土主要分布于东部平原沙区：藁城区（岗上、廉州、兴安等乡镇）、无极县、深泽县”

技术报告 2.2.2.6：“石家庄市风沙土主要分布于东部平原沙区：无极县、深泽县”

说明：工作报告增加了“藁城区”作为风沙土分布区，但技术报告未提及藁城区有风沙土分布。工作报告此处描述可能不准确。

第六部分 其他

1、未给出地图文档，缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

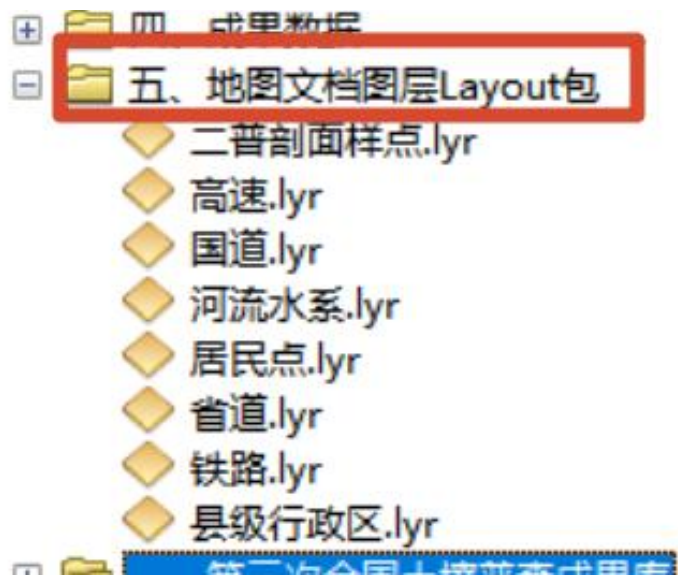

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 7 月 2 日
------	-------	------	----------------
