

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130425 大名县	提交单位	河北冠卓检测科技股份有限公司
--------	------------	------	----------------

第一部分 土壤分类

1、土壤图中存在土壤类型组合与标准不一致

上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 1 个问题

2. 图斑 214：土壤类型组合与省级分类清单不一致

第二部分 制图过程

1、土属土种数量在报告中前后描述不一致

- d.表层土壤质地+底型，指 60-100 cm 为另一质地类型；用“xx 底 xx”表示
- 4.连续命名示例：砂壤底砾石灰性潮土、黏壤底砾湿潮土、砂壤底砾灌淤潮土。
- e.表层土壤质地+上下型，指 0-50 cm 与 50-100 cm 呈现 2 种不同的质地类型；用“xx 下 xx”表示
- 5.连续命名示例：砂壤下黏壤灌淤土。

依据调查结果可知，大名县第三次土壤普查共计 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，29 个土种。

⋮

3.1.1 土壤类型概述

结合大名县成土过程的主要特征，将大名县土壤分为 2 个土类（潮土、褐土）、3 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土），5 个土属（壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、泥砂质潮褐土），31 个土种。

2、推测制图部分没有使用 kappa 系数等验证模型精度

4.6.3 土壤类型推测制图结果分析与应用

4.6.3.1 推测制图结果分析

把土壤推测制图得到的土种类型分布图和不确定性分布图，与基础土壤底图（即分类和坐标系更新后的二普县级土壤类型图）在 GIS 软件中进行空间叠加，并结合专家的经验与遥感影像的判读分析，认为土壤推测制图结果分辨率较低，直接应用会与实际的偏差较大，达不到预期要求。因此，在最终土壤类型的判读与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。并结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图。

4.6.3.2 推测制图结果应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 376 个，其中 36 个图斑应用推测制图结果，涉及土种 3 个，占全县面积的 9.57%。

3、报告中没有明确突出推测制图最优最劣的情况

第三部分 制图结果

1、请根据数据库规范，仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断。

2、如表层样点和剖面样点图层的属性表字段命名不完整，同时缺少所必须的字段

三普表层样								
	样点编号	采样经	采样纬	土样袋	样品编号	土地利	检测实	是否益
	1304250102000505	115.170031	36.244044	130425010200050510	240724226301b19	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000523	115.202216	36.356412	130425010200052310	240724226301b35	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000525	115.300906	36.202397	130425010200052510	240724226301b37	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000528	115.276328	36.164624	130425010200052810	240724226301b39	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000526	115.282962	36.339968	130425010200052610	240724226301b50	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000165	115.097778	36.29245	130425010200016510	240724226272b17	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000510	115.167292	36.44705	130425010200051010	240724226301b20	耕地园地	易景检测服务有	是
	1304250102000514	115.110429	36.453976	130425010200051410	240724226301b25	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000515	115.329072	36.21325	130425010200051510	240724226301b27	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000222	115.23692	36.291391	130425010200022210	240724226280b27	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000238	115.144727	36.355636	130425010200023810	240724226280b42	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000241	115.185038	36.35665	130425010200024110	240724226280b45	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000242	115.385185	36.250286	130425010200024210	240724226280b47	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000735	115.396755	36.228255	130425010200073510	240724226439b05	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000771	115.330203	36.29202	130425010200077110	240724226439b43	耕地园地	易景检测服务有	否
	1304250102000774	115.322768	36.362408	130425010200077410	240724226439b48	耕地园地	易景检测服务有	否

三普剖面样								
	经度	纬度	剖面土	TZ	备注	样品编号	层	
	115.256899	36.226821	均砂壤质石灰性潮土	砂质夹黏潮	化验结果表层砂质且有夹黏层，不改变原土种名称	130425010210000111	1	2
	115.276343	36.229515	均砂壤质石灰性潮土	砂质底壤潮	化验结果表层砂质壤，不改变原土种名称	130425010210000211	1	2
	115.337415	36.269765	砂壤质粘石灰性潮	砂壤质底黏	化验结果表层砂壤质，底层黏质	130425010210000411	1	2
	115.201509	36.287091	均壤质轻度氯化物盐	均壤质潮土		130425010210000511	1	2
	115.137162	36.313956	均壤质石灰性潮土	均壤质潮土		130425010210000611	1	2
	115.265017	36.335175	均砂壤质石灰性潮土	均砂壤质潮		130425010210000711	1	2
	115.128724	36.356228	砂壤质轻度硫酸盐盐	均砂壤质潮		130425010210000911	1	2
	115.215651	36.357876	均黏壤质石灰性潮土	均黏壤质潮		130425010210001011	1	2
	115.317957	36.358751	均壤质石灰性潮土	砂壤质夹黏	表层化验结果偏砂，三普剖面各层质地与化验结果不符，综	130425010210001111	1	2
	115.079556	36.379641	均壤质石灰性潮土	均壤质潮土		130425010210001211	1	2
	115.326834	36.394397	砂壤质底黏石灰性潮	砂壤质底黏		130425010210001311	1	2
	115.184287	36.398767	均壤质石灰性潮土	均壤质潮土		130425010210001411	1	2
	115.274915	36.40029	均黏壤质石灰性潮土	均黏壤质潮		130425010210001511	1	2

3、土壤图存在拓扑问题

空间拓扑检查

检查完成

几何有效性检查：共检查376个图斑，发现1个问题

- 1. 图斑ID210：空间自相交，关键点的空间坐标是[38628021.5353 4004687.4114]

碎屑多边形检查：共检查376个图斑，未发现碎屑多边形

重叠检查：共检查376个图斑，发现1个问题

- 2. 图斑ID204与图斑ID235存在重叠，重叠面积: 4.72 平方米

缝隙检查：共检查376个图斑，零缝隙

重复几何检查：共检查376个图斑，未发现重复几何

4、土壤图中部分图斑的土类或亚类与成土环境对不上，存疑需核查

地形地貌一致性检查

检查完成

坡度检查：共检查376个图斑，发现10个问题


- 1. 图斑 19：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
- 2. 图斑 171：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
- 3. 图斑 183：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
- 4. 图斑 192：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
- 5. 图斑 195：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度
- 6. 图斑 204：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

第四部分 图面表达

1、缺少等高线




2、公路等重要地物没有对名称注记，且公路被切断

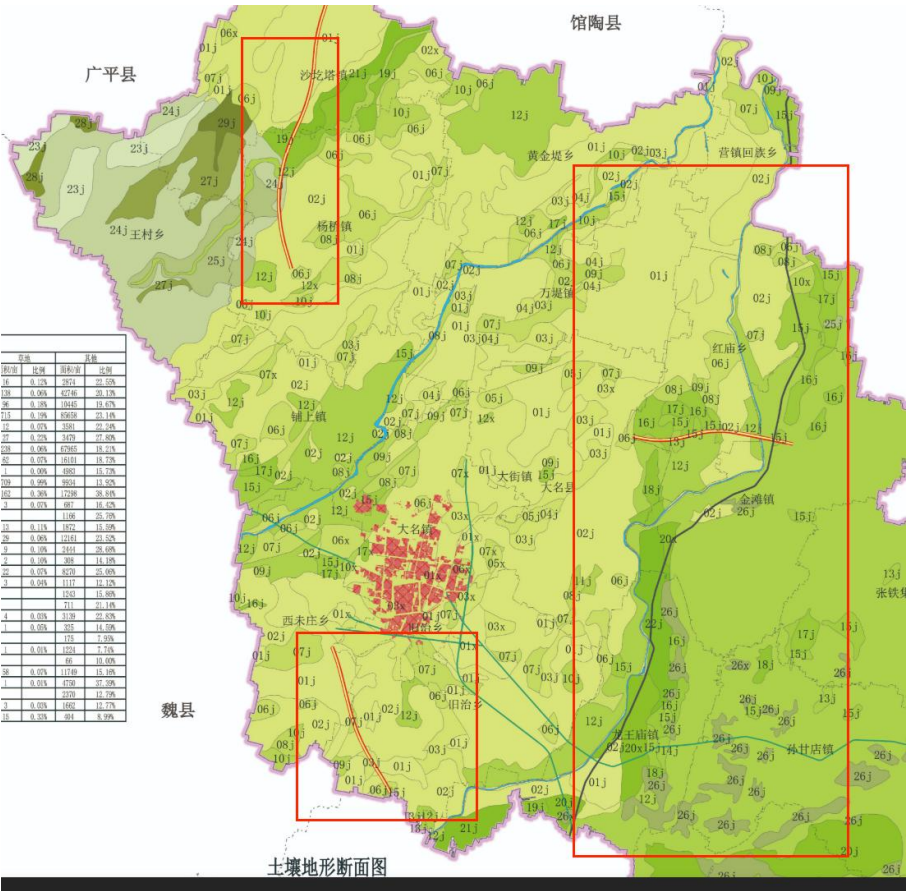


3、图廓不符合外粗内细的规范，且没有标注经纬度

邯郸市大名县三

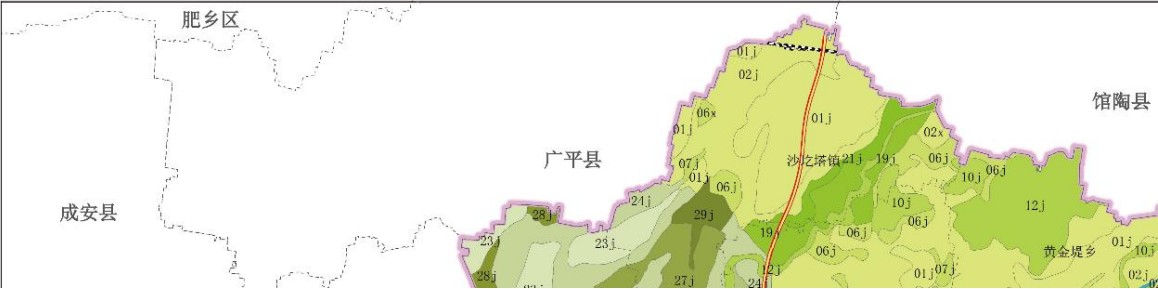

4、断面图未标注土种

土壤地形断面图

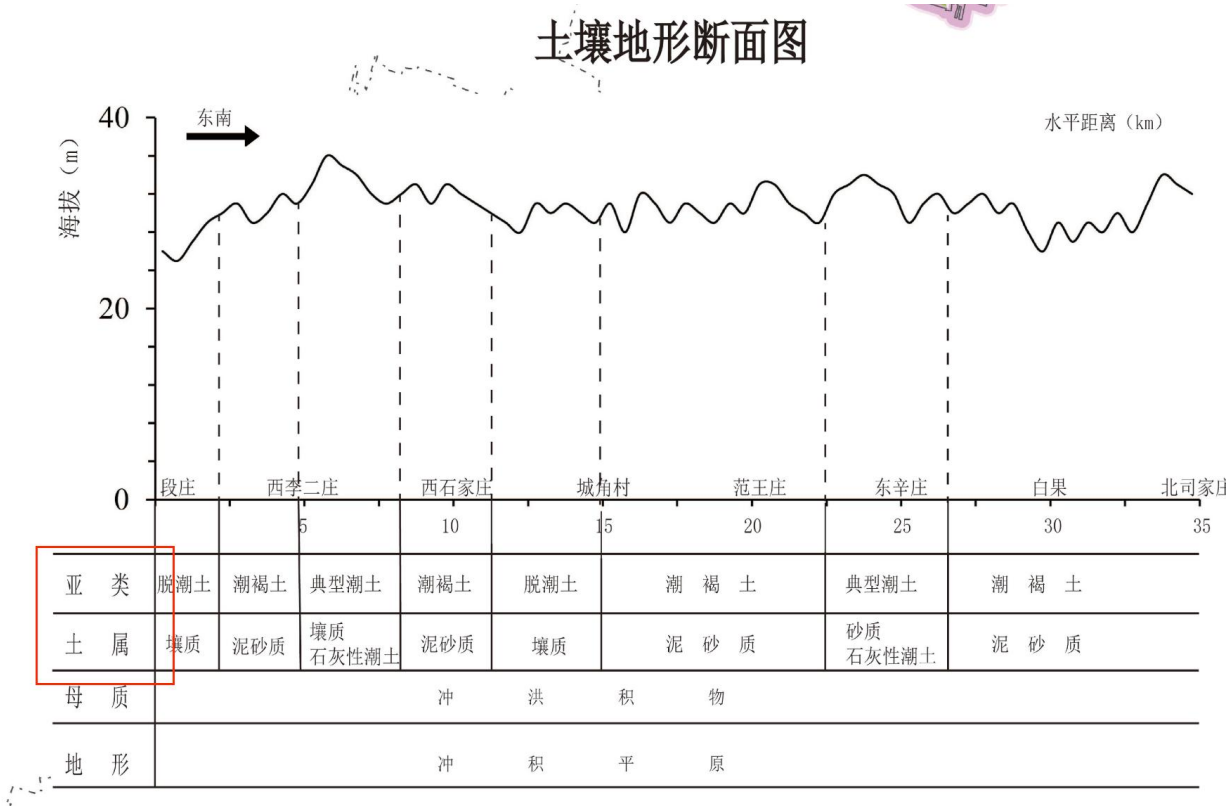

第五部分 报告质量

1、部分表格缺少指标单位

表 3.4 亚类变化表

序号	二普亚类	三普亚类	图斑数量	图斑面积
1	潮褐土	潮褐土	13	6352
2	潮土	典型潮土	309	87314
3	褐潮土	脱潮土	14	8221
4	褐土性土	潮褐土	36	2302
5	褐土性土	典型潮土	1	20
6	盐化潮土	典型潮土	4	1196

表 3.5 土属变化表

序号	二普土属	三普土属	图斑数量	图斑面积
1	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	10	5502
2	粘质潮褐土	泥砂质潮褐土	3	850
3	壤质潮土	壤质石灰性潮土	120	31466
4	壤质潮土	砂质石灰性潮土	1	55
5	沙质潮土	砂质石灰性潮土	125	38087
6	粘质潮土	壤质石灰性潮土	63	17706
7	壤质褐潮土	壤质脱潮土	6	1642
8	壤质褐潮土	砂质脱潮土	8	6579
9	沙质褐土性土	泥砂质潮褐土	36	2302
10	沙质褐土性土	砂质石灰性潮土	1	20
11	氯化物硫酸盐盐化潮土	壤质石灰性潮土	1	1060
12	氯化物硫酸盐盐化潮土	砂质石灰性潮土	3	137

2、面积单位不统一

表 3.6 土种变化表

序号	二普土种	三普土种	土种是否改变	图斑数量	图斑面积（公顷）
1	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	否	9	12784
2	轻壤质底砂潮土	壤底砂石灰性潮土	否	5	687

20

表 3.2 三普土壤类型面积表

面积（亩）	土属	面积（亩）	土种	面积（亩）
			均黏壤石灰性潮土	212345
			均壤质石灰性潮土	370151
			黏壤底砂石灰性潮土	44530
			黏壤夹砂石灰性潮土	4186
			黏壤体砂石灰性潮土	4526
	壤质石灰性潮土	753478	壤底黏石灰性潮土	51711
			壤底砂石灰性潮土	32997
			壤夹黏石灰性潮土	9209

3、报告中标题编号层级使用错误

1.1 地理位置与行政区划

大名县位于邯郸市东南角，东与山东省莘县、冠县接壤，南与河南省的南乐县相连，西部、北部与本省魏县、广平、馆陶毗邻（图 1.1），县域面积 1053 km²，12 镇 8 乡、651 个行政村，总人口 92.7 万。大名地处冀鲁豫三省交界处，1 小时行程圈覆盖 2.5 万 km²、辐射 2000 万人口。

大名县在邯郸市的位置示意图



图 1.1 大名县位置示意图

1.2 成土环境

1.2.1 地形地貌

大名县坐落于华北平原南端，属掩埋古河道的壤质土冲积平原。海拔最高点是王村乡田固村，为 49.29 m，最低点是漳、卫河汇流处南侧 39.8 m，高差 9.49 m；坡降比约为 1:4000。以卫河为界，卫西为漳河冲积扇的边缘，土质粘重。卫东是由黄河冲积物形成的，土质以沙为主。大名县因系河流冲积平原，所以大平小不平，微地貌复杂，但平原是构成大名地貌的主体，占总面积的 90%以上。

1.2.2 母岩母质

4、核查工作报告封面，且无目录




大名县土壤图编制


工作报告

第六部分 其他


1、HISTORY 数据集中缺少二普土壤样点数据

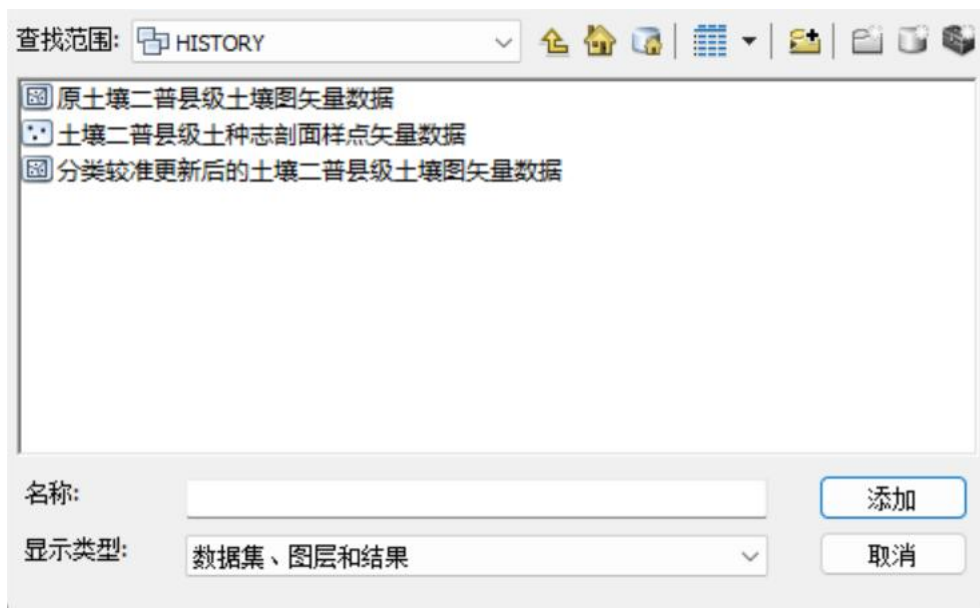


2、PROCESS 数据集中缺少调查样点、不确定性分布图、推测的三普图、土壤二普土壤图室内校核前图斑、土壤二普土壤图室内校核后图斑

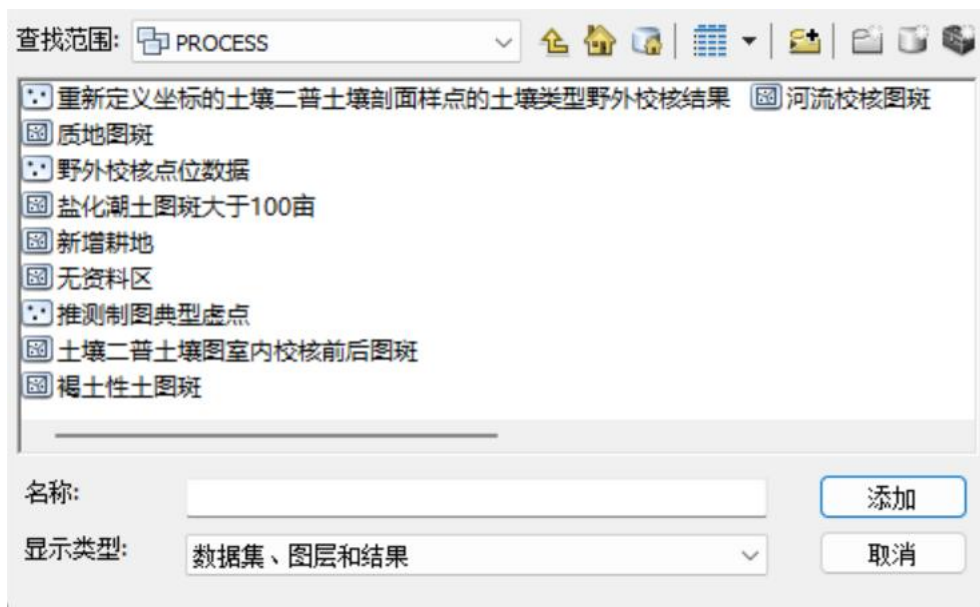

3、地图文档没有设置相对路径



4、技术报告命名有误



第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 12 日
------	-------	------	-----------------
