晋州市第四批土壤类型图评分及整改复核

第三次第四批　土壤类型与制图专题　　专题得分：84 分　　结论：整改后通过

复核材料：第三次第三批已提交质控报告、第四批整改答复及同批 Word、PDF、图件和数据库。

项目	分值	内容	评分要点	得分	对应质控报告及本批评分说明
土壤分类	15	土壤分类系统、历史沿革与对照	分类合理，符合分类方案（试行版）、类型完整、符合本地实际；历史沿革与对比阐述清晰、对应关系合理、依据充分；根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；分类系统存在类型错误或缺失，单次扣 2 分，扣完为止。	13	原第 16 条表 23 现已列 24 个土种。工作报告表 2 仍含均黏壤石灰性潮土、未含壤底黏泥砂质潮褐土，与本批图例及最终数据库的土种组合不一致，扣 2 分。
土壤变化	10	土壤类型变化	类型变化全面、符合实际；变化原因和依据充分，报告与制图结果保持一致，根据偏离程度每项酌情扣 0—5 分；存在类型变化不全，单次扣 5 分，扣完为止。	6	图斑数量已统一为 428 个减至 358 个，减少 70 个。第 3 条标题“潮土转潮褐土”，段末仍写“褐土性土”，扣 2 分；技术报告表 27 二普 30 个土种与工作报告表 3 的 27 个不一致，扣 2 分。
制图过程	20	区县级：制图方法、室内校核、野外踏勘、空间推测 地市级：县级土壤图核验、区县土壤图接边检查、制图综合等	区县级：技术路线和制图方法科学；室内校核和野外踏勘充分、有成效，对于发现的问题能够反馈制图过程以点带面进行修正；对二普土壤图图斑边界全面有效更新。 地市级：技术路线科学、合理，区县级土壤制图过程和结果的校验全面、无遗漏；接边没有明显错误，制图综合方法正确；根据偏离程度每项酌情扣 0—10 分。	15	第四批 Word 和 PDF 的表 20、表 21 中，JZ04 均为均砂质石灰性潮土，原扣 4 分撤销。第 18 条虽改为 4 点，所举同亚类土种仍称“亚类不一致”，扣 3 分；第 24 条排查说明仍包含未与样点对应的亚类差异，扣 2 分。
制图结果	40	制图精度、与二普图对比	图斑边界与气候、母岩母质、地形地貌、土地利用（部分类型）、土壤属性等分布的一致性；与二普对比全面、具体、到位、有对比图。图斑边界明显偏离或类型错误的情况，按占抽查图斑的比例扣分，如 30%的图斑存在明显边界或类型错误，扣 30 分，扣完为止；与二普图对比分析明显不充分，扣 10—20 分。	40	原第 12 条最终图斑数量已统一为 358 个；第 13 条约 0.69 平方米的同种细碎图斑已归并。二普对比图和本批数据库已提交，原反馈涉及的上述结果问题已整改，本项不扣分。
图面表达	5	图面内容配置、要素搭配；着色、注记；图例、比例尺、署名等	图面配置合理，符合规范及相关制图标准要求，易读、美观，根据偏离程度酌情扣 0—5 分。	5	本批成果图图廓外已注明地理底图原比例尺 1∶10000、更新年份 2025 年，图例、比例尺及署名齐全，原反馈的图面问题已整改，不扣分。
报告质量	10	规范性、逻辑性、专业性	撰写认真，文字简练，表述清晰，逻辑性强，结果结论可靠，根据偏离程度酌情扣 0—10 分。	5	训练点残句、海拔 22—31 米、图斑数量、数字字体、亩整数和文献表已改。历史基数与类型变化文字矛盾扣 2 分，仍未核正的两处亚类解释问题扣 2 分，第一章章标题未加粗扣 1 分（18 磅符合小二号，不扣字号分）。
合计	100			84	整改后通过

总评：整改后通过。建议结合第三次第三批土壤类型图质控报告，根据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》和《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》，进一步统一报告、图例与最终数据库的土种组合及二普统计基数，核正类型变化起始对象、剖面校核和验证排查的亚类解释，清理异地县名，补齐乡镇耕地分类统计及元数据，规范报告标题字体。

原质控报告：石家庄市_晋州市_土壤类型图_河北图宇科技有限公司_2026 年第三次第三批.pdf。

评分依据：《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》（国土壤普查办发〔2026〕3 号）附件 3 表 3.5-1。不同项目按原表注 1 独立评分，酌扣分值按实际偏离程度确定。

一 第四批整改答复复核情况

原反馈 30 条，第四批答复 30 条，逐条实物核对 30 条。状态：整改通过 18 条；整改不通过 9 条；未整改 2 条；原反馈更正 1 条；缺件 0 条。

本次按原反馈核对整改及直接关联内容，保留已正确完成的整改；各评分项说明与逐条答复复核列于后文。专题总评按本轮评分口径为整改后通过，所列未改到位内容仍须落实。

二 逐项评分说明

1 土壤分类 15－2＝13 分

对应原反馈：原第 2、16 条。

技术报告最终表 23 和数据库均为 24 个土种，原第 16 条数量问题已调整。工作报告表 2 仍列“均黏壤石灰性潮土”，未列“壤底黏泥砂质潮褐土”；最终数据库和主图图例采用后一种组合。问题是同批最终清单对应不一致，按原表分类合理、类型完整与对应依据要求酌扣 2 分，不把两个表述拆成两次固定扣分。

数据库核对：最终层 358 条、24 个不同 TZ。均黏壤石灰性潮土：不在最终 TZ 集合；壤底黏泥砂质潮褐土：在最终 TZ 集合。

图 1 第四批晋州市工作报告 PDF 第 19 页

普土种信息一览表，如下表所示。


表2三普土种信息一览表

土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
			均黏壤石灰性潮土	489
			均壤质石灰性潮土	2815
			壤底黏石灰性潮土	1562

图 2 第四批晋州市技术报告 PDF 第 67 页

			砂壤夹黏脱潮土	926	0. 10%
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	3110	0. 34%
			均砂壤泥砂质潮褐土	58	0. 01%
			壤底黏泥砂质潮褐土	510	0. 06%

图 3 第四批《晋州土壤图.jpg》图例下部 潮褐土土种

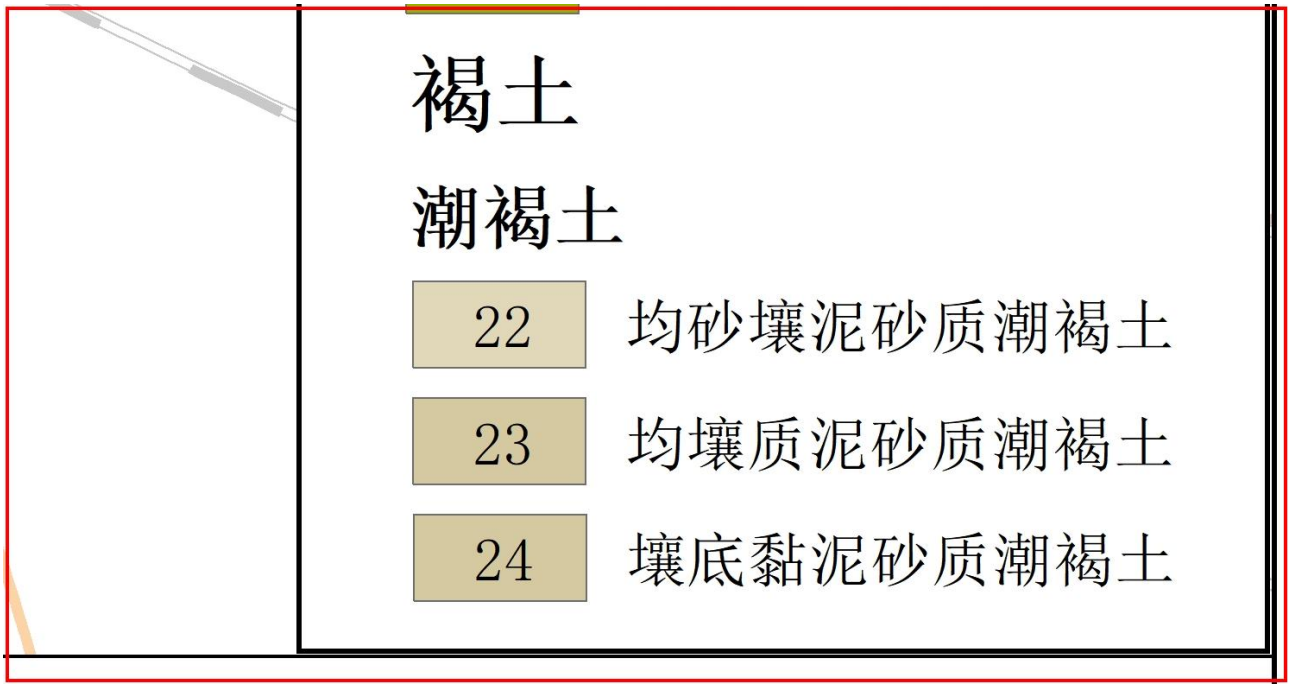

2 土壤变化 10－2－2＝6 分

对应原反馈：原第 3—5 条。

图斑 428 减至 358、减少 70 个已经统一。技术报告第 3.2.2.1 节第一项标题为“潮土—潮褐土”，段末仍写“褐土性土变为潮褐土”，同一变化的起始类型不一致，扣 2 分；技术报告表 27 二普 30 个土种，工作报告表 3 二普 27 个土种，历史基数未统一，扣 2 分。两项均按变化解释和依据的偏离程度酌扣，原已改正的图斑增减不再扣分。

图 4 第四批晋州市技术报告 PDF 第 23 页

类型：①土类与亚类发生改变。②土属类型发生变化。

3.2.2.1.土类与亚类发生改变

（1）潮土-潮褐土。二普时期潮土主要分布在缓岗沙丘地带，经历 40 年平整土地、种植粮食作物、海拔有较大幅度下降、土体下部出现地下水升降而产生的锈纹锈斑，在 30-50cm 出现弱黏化钙积层，使得褐土性土变为潮褐土。

（2）褐潮土-潮褐土：晋州市从二普到三普，西北部冲积扇中上部的褐潮土区部分地块转为潮褐土，本质是人为干预下长期漫灌、秸秆还田及水肥管理增强、地下水影响活度介入，叠加黏化作用深化的成土过程转变，改变了土壤原有的水

图 5 第四批晋州市技术报告 PDF 第 75 页

州市土类、亚类单元进行对比校准，后根据暂行土壤分类系统中土属和土种的划分依据，对土属、土种的母质、质地进行规范化、标准化，同时根据暂行土壤分类系统土种命名顺序、字词规范，对土种名称进行规范化。

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：二普 428 个，三普 358 个，减少 70 个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对 87 个图斑边界进行了调整。

土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 27 土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	2 个	2 个	不变
亚类	3 个	3 个	不变
土属	4 个	5 个	增加 1 个
土种	30 个	24 个	减少 6 个

图 6 第四批晋州市工作报告 PDF 第 22 页

二普与三普土壤类型的具体变化：①图斑：减少70个。②边界：二普矢量图土种边界存在整体偏移情况，依据高分影像、数字高程等对图斑边界进行了调整。土壤类型整体变化一览表，如下表所示。

表 3土壤类型整体变化一览表

类别	二普	三普	变化情况
土类	2个	2个	不变
亚类	3个	3个	不变
土属	5个	5个	不变
土种	27个	24个	减少3个

3 制图过程 20－3－2＝15 分

对应原反馈：原第 6、18、24 条。

原 JZ04 两表不一致的反馈经回看第三批质控报告原截图，确认原两表即均为“均砂质石灰性潮土”，属于原反馈更正；第四批 Word、PDF 两表仍一致，不扣 4 分。仍保留两处过程说明扣分：PDF 第 39 页第 4.3.2.4 节虽改为 4 点，后文两组土种各自同属一个亚类，却仍概括为“亚类不一致”，与表 18 未逐一对应，酌扣 3 分；PDF 第 72 页对应验证说明仍把无亚类差异的点概括为亚类划分差异，处理关系未核清，酌扣 2 分。本项 15 分。

图 7 第四批晋州市技术报告 PDF 第 47 页

102	JZ06-1	深位中层粘轻壤质褐潮土	壤底黏脱潮土	均黏壤脱潮土
103	JZ21	砂质潮土	均砂质潮土	均砂质石灰性潮土
104	JZ52	轻壤质褐潮土	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土
105	JZ04	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
106	JZ82	浅位厚层砂轻壤质褐潮土	壤体砂脱潮土	壤体砂脱潮土
107	JZ59	深位中层粘轻壤质褐潮土	壤底黏脱潮土	壤底黏脱潮土

图 8 第四批晋州市技术报告 PDF 第 52 页

通过野外踏勘土种踏勘名为均壤质泥砂质潮褐土，均与矢量图土种相同。

4.5.2.3.三普剖面样点、三普表层样点与二普矢量图土种吻合性踏勘结果

亚类不一致、土层厚度和土体构型不一致的图斑，野外踏勘结果均与三普剖面保持一致。

4.5.2.4.新增耕地点位踏勘结果

新增耕地，选取具有代表性的图斑布设踏勘点位，共布设 12 个踏勘点位。1:5 万县级土壤图的最小上图单元，对图上 0.5cm^2 ，实地面积 12.5 公顷以下的图斑进行了合并。踏勘后，新增耕地面积均小于 12.5 公顷，对新增耕地图斑进行了合并。新增耕地踏勘点位信息一览表，如表 21 所示。

表 21 新增耕地踏勘点位信息一览表

序号	点位名称	矢量图土种	省级对照表的土种名称	野外踏勘结果土种名称
1	JZ04	砂壤质潮土	均砂壤质潮土	均砂质石灰性潮土
2	JZ07-1	深位中层砂轻壤质褐潮土	壤底砂脱潮土	均壤质脱潮土
3	JZ08	轻壤质褐潮土	均壤质脱潮土	均壤质脱潮土

图 9 第四批晋州市技术报告 PDF 第 39 页

校核。晋州市自然土壤和耕作土壤变化较少且不够上图面积，未进行细分。

4.3.2.4.校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性

晋州市共有三普剖面样点 24 个，校核发现 4 个样点与二普矢量图不一致，两个剖面样点与二普矢量图亚类不一致。因为根据三普剖面样点修改，1 个样点因表层质地不一致，结合表层样数据进行核实，选取 2 个进行野外校核；观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终有 2 个图斑需野外校核验证。设置野外校核点 2 个。涉及与二普土壤图不一致的三普剖面样点分布图，如表 18 所示。

表 18 三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位一览表

二普土种	剖面样点土种名称	三普土种	问题类型	点位编号
轻壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	均壤质脱潮土	亚类不一致	JZ53
轻壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	均壤质脱潮土		JZ56
深位薄层粘轻壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	壤底黏脱潮土		JZ38
浅位薄层粘中壤质褐潮土	轻壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	亚类、质地不一致	JZ24

三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性校核点位分析：（1）土类、亚类不同。亚类不一致的剖面样点 2 个：其中一个图斑二普土种为轻壤质泥砂质潮褐土，三普剖面土种为均壤质泥砂质潮褐土；另一个图斑二普土种为砂质脱潮土，剖面样点土种名称为均砂质脱潮土，将该图斑标记进行野外踏勘。（2）表层质地不同。表层质地不同的剖面样点有 1 个，结合表层样数据进行核实，符合剖面

4 制图结果 40－0＝40 分

对应原反馈：原第 12、13 条及本批制图结果对应整改。

本批最终层为 358 个图斑，技术报告与工作报告图斑变化均为减少 70 个；原约 0.69 平方米同种细碎图斑已不在现行最终层中。二普对比图、对应表和本批数据库已提交，原结果问题不再延续扣分，得 40 分。

数据库核对：土壤三普土壤类型成果图：358 条、24 种 TZ；本批验证记录 JZTK017 所列验证土种与相应验证记录核对，不以“标为否”自动判为填错。


对应原页见图 5。

5 图面表达 5－0＝5 分

对应原反馈：原第 10 条及图面表达相关反馈。

本批主图图廓外已列国土空间监测底图、原比例尺 1∶10000、更新年份 2025 年；图例、比例尺和署名等图面要素已核对。原图面形式问题不继续扣分。图例与工作报告清单的不一致已在土壤分类项体现。

图 10 第四批《晋州土壤图.jpg》图廓外底图来源 原比例尺及更新年份



6 报告质量 10－2－2－1＝5 分

对应原反馈：原第 3、5、18、24 条及格式反馈。

历史基数与类型变化文字矛盾扣 2 分；两处未核正的亚类解释和处理关系影响报告逻辑，扣 2 分；第一章章标题未加粗扣 1 分；18 磅符合小二号，不扣字号分。JZ04 已经一致，不再作为该项扣分事实。训练点残句、海拔 22—31 米、图斑数量、数字字体、亩整数和文献表等已改，不再扣分。本项维持 5 分。乡镇耕地分类统计和元数据仍须按原反馈补齐，本项没有另加一轮扣分。

对应原页见图 4。

对应原页见图 5。

对应原页见图 6。

对应原页见图 9。

图 11 第四批晋州市技术报告 PDF 第 76 页

第五章 结论与建议

5. 1. 结论

三 第四批整改答复逐条复核

以下原条号对应随附第三次第三批质控报告。PDF 页序从文件首页起计，包含封面与目录；答复内容以第四批修改说明为准。

P01 整改通过

原反馈：本次相关数据库的两份县域土壤图层均缺乡镇名 XZM 及原二普分类 YTL、YYL、YTS、YTZ 字段。核查记录：现有 XM、TL、YL、TS、TZ 不能替代这些字段。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：本批 GDB 土壤三普土壤类型成果图，358 条全量读取

复核结果：当前最终成果层 358 条记录已具备乡镇名 XZM 和原二普 YTL、YYL、YTS、YTZ，五字段逐条读取均无空值。

评分处理：原缺失字段问题不再扣分

P02 整改不通过

原反馈：工作报告成果图图例仍列“壤底黏泥砂质潮褐土”，典型潮土仅列 8 个土种；验证后的表 2 却不列上述潮褐土土种，并增加“均黏壤石灰性潮土”，典型潮土为 9 个土种。该图未与同报告验证后的最终分类表一致。

第四批答复：此意见已按要求更新成果图

现行位置：工作 PDF 第 19—21 页表 2 和图 3；技术 PDF 第 67 页表 23；本批晋州土壤图.jpg 图例；GDB24 个不同 TZ

复核结果：答复称已更新成果图；现行工作表 2 仍有均黏壤石灰性潮土 489 亩，未列壤底黏泥砂质潮褐土；现行技术表 23 及最终层、成果图图例有壤底黏泥砂质潮褐土，没有均黏壤石灰性潮土。各处虽均为 24 个，但组合不同，典型潮土 9 对 8，潮褐土 2 对 3，原图表不一致未改到位。

评分处理：土壤分类保留酌扣 2 分，得 13/15；不能把总数相同当分类已统一

P03 整改不通过

原反馈：第 3.2.2.1 节第（1）项标题写潮土转为潮褐土，正文却写褐土性土转为潮褐土；第（2）项标题写褐潮土转为潮褐土，结尾又写修正为典型潮土。同一变化事项的起始或最终分类前后不一致。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 23 页第 3.2.2.1 节

复核结果：第（2）项标题及结尾已统一为褐潮土转潮褐土；第（1）项标题仍为潮土—潮褐土，段末仍为“使得褐土性土变为潮褐土”，同一事项的起始类型仍不一致。

评分处理：土壤变化保留酌扣 2 分；报告质量类型变化文字矛盾综合扣分范围包括此项

P04 整改通过

原反馈：技术报告写二普 428 个图斑、三普 351 个、减少 77 个，工作报告却写减少 72 个。两报告对同一图斑数量变化的结果不一致。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 75 页；工作 PDF 第 22 页；GDB 最终层 358 条

复核结果：技术现为二普 428、三普 358、减少 70；工作同为减少 70，428-358=70，与当前最终 358 条一致。

评分处理：原图斑增减矛盾不再扣分

P05 整改不通过

原反馈：工作报告前文二普土种数为 28 个，表 3 为 27 个、三普 24 个并写减少 3 个；技术报告表 27 为二普 28 个、三普 24 个、减少 4 个。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：工作 PDF 第 5、22 页表 3；技术 PDF 第 75 页表 27

复核结果：工作历史段已改二普 30，但表 3 仍二普 27、三普 24、减少 3；技术表 27 二普 30、三普 24、减少 6，同对象同阶段基数仍不一致。

评分处理：土壤变化保留酌扣 2 分；报告质量历史基数综合扣分范围包括此项

P06 原反馈更正

原反馈：同一踏勘点 JZ04，表 20 的野外踏勘结果为均砂壤石灰性潮土，表 21 却为均砂质石灰性潮土；同次记录的表层质地名称不一致。

第四批答复：此意见未做修改

现行位置：第三次第三批已提交质控 PDF 第 11—12 页 P06 及两张旧原图；第四批技术 PDF 第 47、52 页；第四批 Word 表 20、21

复核结果：第三次第三批已提交质控报告第 12 页两张旧原件截图中，JZ04 在表 20、表 21 原本均为均砂质石灰性潮土。第四批 Word 及 PDF 两表也一致，答复称未做修改与原截图相符。原反馈文字将表 20 误读为均砂壤石灰性潮土，应撤销原判断，不计作作业单位整改通过。

评分处理：撤销原误判及制图过程 4 分扣分，总分调整为 84 分。原反馈更正单列 1 条，不计入整改通过数量。

P07 整改通过

原反馈：工作报告推测制图段仍残留“括二普剖面点 48 个、三普剖面样点 11 个、野外踏勘点位 105 个、野外接边踏勘样本次……”的未完成句，随即重复 1205 个训练点的统计。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：工作 PDF 第 18 页（五）

复核结果：工作训练集段现为 1205 个，其中 204 实际点（48 二普、24 三普剖面、132 外业）及 1001 典型虚点，原括号残句及重复句已清除。

评分处理：原训练点残句不再扣分；不扩展为本轮重新审查整个建模数据

P08 整改通过

原反馈：技术报告记载初始采用 11 个环境变量、卡帕系数 0.2551，去掉平面曲率和坡度后采用 9 个变量、系数 0.5376；工作报告却写初始 9 个变量、系数 0.2551，再去掉上述两个变量。两报告对同一次模型优化的初始变量数量不一致。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：工作 PDF 第 18 页（五）；技术第 4.6.2.3 节现行原文

复核结果：工作现明确 11 个环境变量、0.2551，减少平面曲率和坡度后 9 个、0.5376，与技术对应优化过程一致。

评分处理：原初始变量数量矛盾不再扣分

P09 整改通过

原反馈：验证点 JZTK017 在表 24 的验证土种为均壤质脱潮土，表 25 却为均砂壤质石灰性潮土，同一验证结果的亚类和质地不同。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 71—72 页表 24、25；本批验证层 JZTK017 记录

复核结果：表 24、表 25 的 JZTK017 验证土种现均为均壤质脱潮土；三普图原类型壤底黏脱潮土与验证类型不同，均标否是正确记录，不能要求三普图列与验证列也完全同名。

评分处理：原同一验证结果两表不一致不再扣分

P10 整改通过

原反馈：图廓外列有调查时间、制图时间、投影及成果图比例尺，但未注明地理要素所采用地形图的比例尺和时间。上述底图来源信息不同于成果图自身比例尺和制图时间。

第四批答复：此意见已按要求四个县重新出图

现行位置：本批晋州土壤图.jpg 下方图廓外；工作 PDF 第 21 页图 3

复核结果：图廓外现列地理底图资料国土空间监测、原比例尺 1:10000、更新年份 2025，与成果图 1:50000 和制图时间分开表达。

评分处理：原底图比例尺与时间缺注不再扣分

P11 未整改

原反馈：两份报告未列各乡镇耕地土壤分类面积统计表。技术报告表 26 统计各乡镇的亚类总面积，未区分耕地；图中按土地利用类型统计的全市土种面积表也不能代替各乡镇耕地分类面积表。

第四批答复：此意见未修改，三普土壤类型图内已有该表格

现行位置：技术 PDF 第 74—75 页表 26；本批晋州土壤图.jpg 右下地类面积表；两报告全部表格

复核结果：答复称未修改、图内已有表格。实物图上是全市土种×水浇地/旱地/园地/林地/草地/其他面积表，不分乡镇；技术表 26 为乡镇亚类全部面积而不分耕地。未形成各乡镇耕地土壤分类面积统计，不能用这两张表代替。

评分处理：沿用既有评分口径：作为继续完善事项，不另增加扣分，也不以此自动否决

P12 整改通过

原反馈：技术报告写最终三普图 351 个图斑；相关库两份县域综合前土壤图分别为 359 个、352 个图斑，未说明本次最终成果与这两份图层的对应和衔接。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 75 页；本批 GDB 土壤三普土壤类型成果图

复核结果：当前技术最终三普 358 个与本批最终成果层 358 条一致，原 351 对 359/352 的版本对应问题已消除；最终层与扣除建成区水系列分开记录。

评分处理：原最终图层图斑数不一致不再扣分，制图结果 40 分

P13 整改通过

原反馈：相关县域土壤图保留同种相邻的细碎图斑：第一图层 OBJECTID8135、第二图层 OBJECTID7873 均为均壤质脱潮土，面积 0.691622 平方米、长约 18.81 米，与相邻同种大图斑共享约 18.81 米边界。核查记录：该同种狭长碎片未归并。

第四批答复：此意见已按要求做合并处理

现行位置：当前 GDB 最终层 358 几何面积全量读取；Word 图件及字段核对.json 最小 10 面

复核结果：答复称已合并。实读当前最终层 358 面，最小面 3580.013 平方米，原 0.691622 平方米同种狭长碎片已不再作为独立面存在。未将本条复核扩大为整县新一轮拓扑质控。

评分处理：原同种细碎片问题不再扣分

P14 未整改

原反馈：相关两份县域土壤图层的元数据未填写行政区代码、数据摘要、负责单位、联系人、电话、通信地址和邮政编码等必填内容；本次未找到包含这些内容的配套元数据 XML。

第四批答复：此意见未修改，相同作业方法下各单位均未提此问题，具体修改需老师指导

现行位置：本批 GDB 三层原生 Metadata XML，已保存本审计目录；177 个晋州源成员实核

复核结果：答复明确未修改、需老师指导。当前 GDB 最终层、扣除建成区水系层和野外验证层 GetLayerMetadata 原生 XML 已重读，仍只有自动名称、投影和处理历史等，缺行政区代码、摘要、负责单位及联系人等对应标识；原包没有另附完整元数据 XML。

评分处理：本轮不新增独立扣分，按原反馈继续完善，不因其他单位未提出便判符合

P15 整改通过

原反馈：第 1.2.2 节记载全市海拔 35～46.5 米，表 9 却列出 22～31 米的典型断面高程，断面图也采用相应高程。两处高程范围不一致。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 7 页第 1.2.2 节；第 20 页表 9 及断面

复核结果：县域概况海拔已改 22～31 米，原 35～46.5 米与表 9/断面约 22～31 米的大幅冲突已消除；本条仅复核原具体范围矛盾，不冒称重新验证全市 DEM。

评分处理：原高程范围矛盾不再扣分

P16 整改通过

原反馈：第 4.7 节表 23 实际列出 25 个土种，表前却写 24 个。

第四批答复：此意见已重新插入新表格

现行位置：技术 PDF 第 67 页表 23；当前 Word 表 23 全部 24 行；GDB24 个不同 TZ

复核结果：当前表 23 实际 24 个土种，表前亦为 24，数量一致，且名称集合与当前最终 GDB24 个 TZ 对应；工作表 2 组合问题另按原第 2 条保留。

评分处理：原表 23 行数 25 对正文 24 的问题不再扣分

P17 整改通过

原反馈：报告第 1.2.2 节明确全境无山地、丘陵，但技术报告第 3.2.2.1 节仍写西北部丘陵，工作报告推测制图段写晋州市山区，建议段写北部丘陵。上述地貌描述与本市概况不一致。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 23 页；工作 PDF 第 18、24 页

复核结果：原三处具体地貌措辞已改：技术变化段为西北冲积扇，工作推测制图为晋州市平原，建议改为西北偏高、东南微倾的冲洪积平原和古河道沙地平缓田面。

评分处理：原明确三处山区/丘陵措辞不再扣分；不把泛论地形枚举自动当新增本地错误

P18 整改不通过

原反馈：第 4.3.2.4 节写 3 个剖面样点与二普图不一致，表 18 实际列 JZ53、JZ56、JZ38、JZ24 共 4 点。表后举例的土种组合又与表 18 不对应。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 39 页第 4.3.2.4 节表 18 及后文；当前 Word 同位置

复核结果：样点总数由 3 改为 4 且表 18 确列 JZ53、56、38、24；但表后仍把轻壤质泥砂质潮褐土与均壤质泥砂质潮褐土（均潮褐土）、砂质脱潮土与均砂质脱潮土（均脱潮土）称为亚类不一致，且例子未对应表 18 四点。

评分处理：制图过程保留酌扣 3 分；报告质量两处亚类解释综合扣 2 范围包括此项

P19 整改通过

原反馈：第 4.5.2.4 节写新增耕地共布设 13 个踏勘点，表 21 仅列 12 点，最后一行为序号 12、JZ88。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 52—53 页表 21 及第 4.5.2.4 节

复核结果：新增耕地段现写布设 12 个，表 21 从 JZ04 起至 JZ88 止共 12 行，原 13 对 12 矛盾已消除。

评分处理：原新增耕地踏勘点数量矛盾不再扣分

P20 整改通过

原反馈：第 4.6.3.1 节的推测结果分析仍列半固定风沙土、砂质冲积物石灰性褐土、砂质冲积物褐土性土等名称，未与本次分类表列出的 5 个土属对应。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 65 页第 4.6.3.1 节

复核结果：第 4.6.3.1 节已改为当前 2 土类、3 亚类和 5 土属，土属现为壤质石灰性潮土、砂质石灰性潮土、壤质脱潮土、砂质脱潮土、泥砂质潮褐土，原历史土属混用已改。

评分处理：原旧分类混入本次推测结果分析不再扣分

P21 整改不通过

原反馈：技术报告脱潮土“特征和利用性能”段重复典型潮土的内容，并保留“仅有典型潮土一个亚类”的表述，未准确说明脱潮土自身特征。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 77 页第 5.2.1.2 节；当前 Word 同段

复核结果：脱潮土段已重写为过渡亚类特征，原“仅有典型潮土一个亚类”错误已去除；但重写段仍写“分布在藁城区滹沱河西部两岸及东南区域”，将异地县名带入本市改良建议，同事项未改到位。

评分处理：在逐条复核记录，不在当前 84 分之外追加无关扣分

P22 整改不通过

原反馈：工作报告“目的”段写本市“褐土为主、潮土与风沙土零星分布”，本次类型面积表却以潮土为主体、未列风沙土。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：工作 PDF 第 5 页（二）1 目的；第 19—20 页本次分类；GDB24 种 3 亚类

复核结果：工作目的段已从褐土为主改为褐潮土为主，但仍将历史褐潮土名称用于本次现状，后句仍列风沙土；本批分类为典型潮土、脱潮土、潮褐土且没有风沙土，本次现状与二普历史未分清。

评分处理：保留报告完善意见，沿用 84 分，不另追加扣分

P23 整改通过

原反馈：工作报告“队伍建设”将河北农业大学写为“河北省土农业大学”。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：工作队伍建设及人员保障现行原文；PDF 第 13 页人员保障

复核结果：原队伍建设中的河北省土农业大学已改河北农业大学，与当前人员保障段一致；原错名全文未再检出。

评分处理：原单位错字不再扣分

P24 整改不通过

原反馈：第 4.7.2.3 节将两处验证不一致归因为土层厚度划分差异，但表 24、表 25 所列差异涉及质地、土体构型及亚类，未列土层厚度差异或说明其与这两处分类判别的关系。排查说明未与具体错误类型对应。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 71 页表 24、第 72 页第 4.7.2.3 节及表 25

复核结果：原仅用土层厚度解释已改成质地、土体构型及亚类，但具体仍不准确。JZTK017 的图上壤底黏脱潮土与验证均壤质脱潮土均属脱潮土，差别为构型/质地；JZTK002 图上均砂质石灰性潮土与验证均砂壤石灰性潮土均属典型潮土，差别为质地。两处均无亚类改变，当前仍写亚类划分依据差异，未与具体错误类型闭合。

评分处理：制图过程保留酌扣 2 分；报告质量两处亚类解释综合扣 2 范围包括此项

P25 原反馈部分更正，未加粗未通过

原反馈：技术报告第一层章标题实际字号为 18 磅，未按小二号 22 磅设置。小节采用 2.1 等十进制层次编号，也未按正式报告的“一、”“（一）”“1.”“（1）”对应层级设置。（原反馈字号换算更正：小二号为 18 磅。）

第四批答复：此意见已按要求统改

现行位置：技术报告 Word 第一章、第五章章标题；PDF 第 6、76 页

复核结果：章标题 18 磅对应小二号。第一章未加粗，仍不符合宋体加粗要求；第五章已加粗。编号体系按本轮要求排除，不扣分。

评分处理：报告质量仅按第一章未加粗扣 1 分；18 磅字号不扣分

P26 整改通过

原反馈：工作报告表 1 内 WorldClimv2、DEM 等英文实际采用宋体，未采用规定的 TimesNewRoman。

第四批答复：此意见已按要求统改

现行位置：工作报告表 1 中 WorldClim、DEM 等英文名称

复核结果：工作报告表 1 中 WorldClimv2、DEM 等英文字母已采用 Times New Roman，原宋体使用问题已改。

评分处理：原英文字体不再扣分

P27 整改通过

原反馈：技术报告表 8、表 23 及工作报告表 2 的面积以亩计，仍保留小数，未按正式报告面积计量格式保留整数。

第四批答复：此意见已按要求统改

现行位置：现行 Word 技术各亩面积表及工作表 2 全部数值单元格

复核结果：当前两报告全部亩面积表数值单元格已逐表检查，没有纯面积小数；技术表 8、23 及工作表 2 原指定位置均已改整数。

评分处理：原面积小数问题不再扣分

P28 整改通过

原反馈：技术报告和工作报告文后均未列主要参考文献。正文中提及规范名称不能替代文后参考文献表。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术 PDF 第 78 页；工作 PDF 第 24 页

复核结果：技术文后第 5.2.1.4 和工作文后 5 均已列主要参考文献，各 11 项书目，原文后缺文献已补。

评分处理：原缺文后文献不再扣分

P29 整改不通过

原反馈：第 1.3 节已注明 2025 年度国土变更调查数据，但未补列全市各类土地的具体面积；报告全文和成果图中也未列全市各类土地面积汇总。对应审查：九、报告内容及文字格式第 1 项。

第四批答复：此统计表在晋州市三普土壤类型图内有体现

现行位置：技术 PDF 第 9 页第 1.3 节；本批晋州土壤图.jpg 右下地类面积表

复核结果：答复称土壤图有体现。主图确已列土种×地类的面积明细，不能再称成果图完全没有土地利用类型面积；现行技术第 1.3 节仍只有分布描述，没有引用图内具体地类面积或地类合计及统计口径。建议直接补入现有图表的统计结果，不要求另设一张独立土地利用表。

评分处理：本条作为文字完善事项，不新增独立必交表或额外扣分，维持既有评分口径

P30 整改通过

原反馈：图 14 图例文字仍有明显像素化，点位数据和图层名称模糊，未替换为清晰原图。对应审查：九、报告内容及文字格式第 2 项。

第四批答复：此意见已按要求做如下修改

现行位置：技术报告 PDF 第 58 页图 14；第四批答复第 30 条附图

复核结果：现行技术报告图 14 已更换，图例中的推测制图虚点数据、行政区、土壤三普土壤类型成果图等名称现可辨读，与第四批答复附图对应，原图例模糊问题已改善。

评分处理：原图例无法辨识问题不再扣分；不以答复自称已改替代原生图核查

依据与材料

原质控报告：石家庄市_晋州市_土壤类型图_河北图宇科技有限公司_2026 年第三次第三批.pdf；本批整改答复：晋州市修改说明.docx。

正式技术依据：《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》验证路线条款（PDF 第 22 页）；《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》类型图面积统计、报告格式及相关工作报告要求。省分类清单采用《河北省土壤分类系统清单表 20260822.xls》。
